

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (งบดำเนินงาน/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น/สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖
- ๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)
- ๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) รายงานเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย
- ๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค) รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ
- สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๕ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม



มติที่ประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ


รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

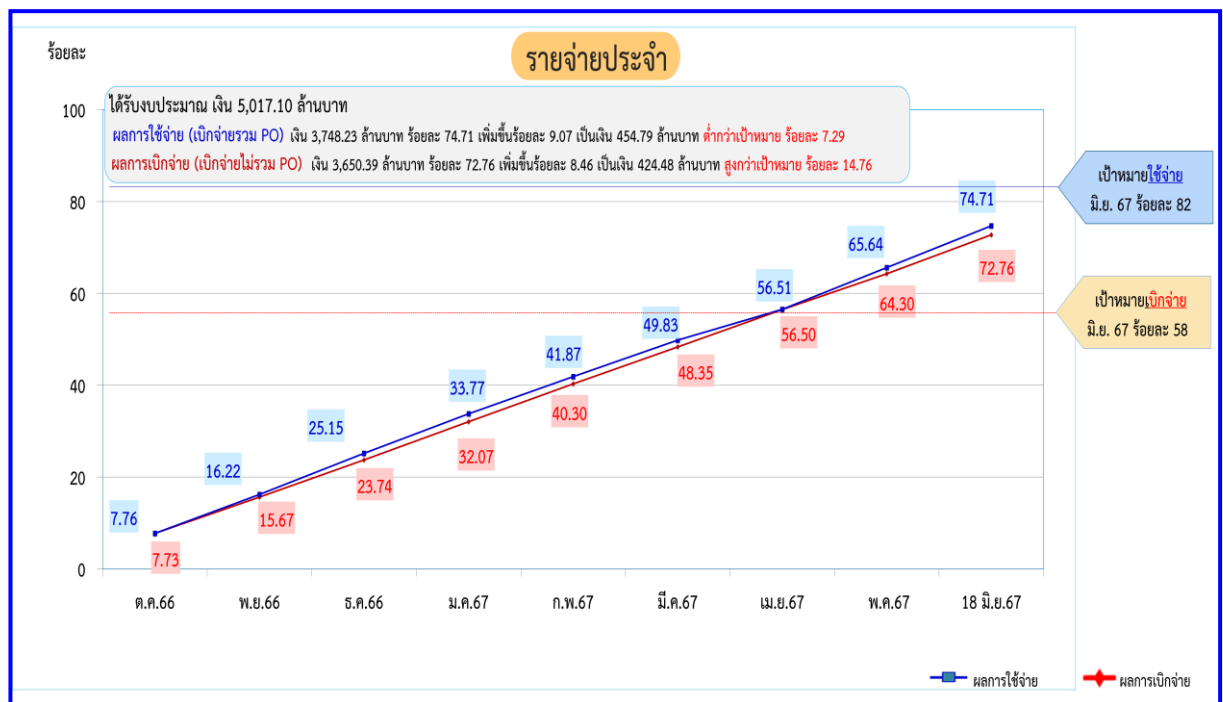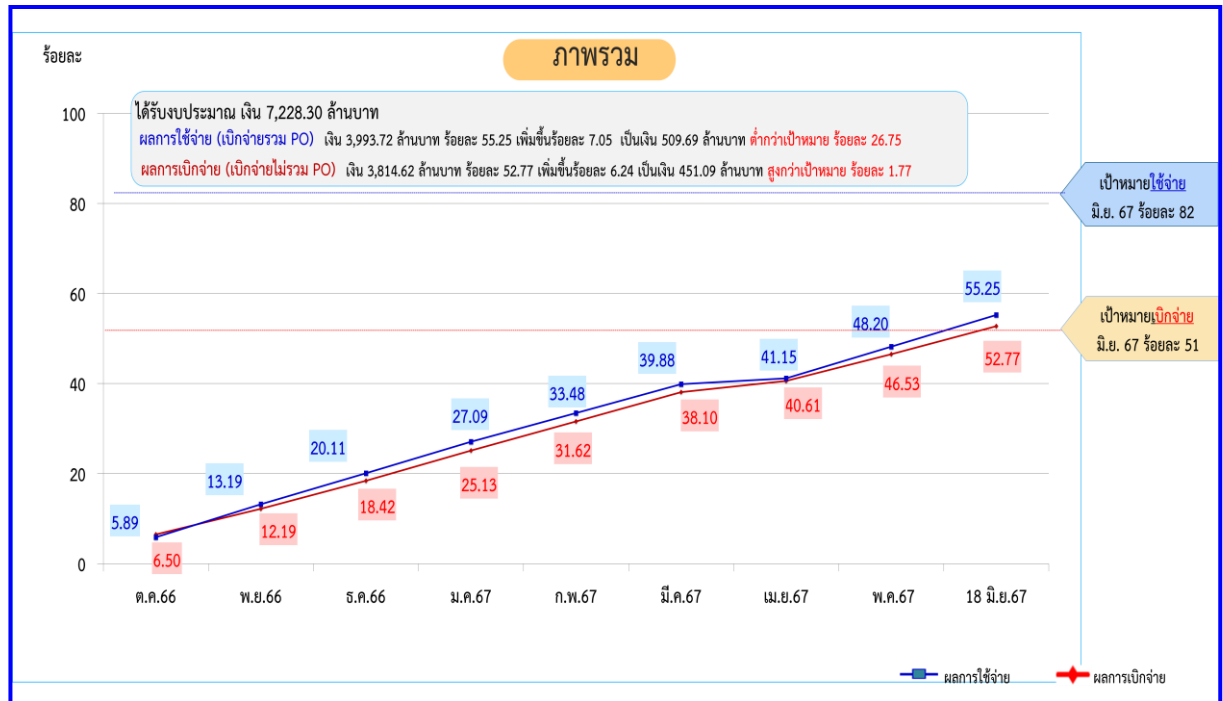



๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

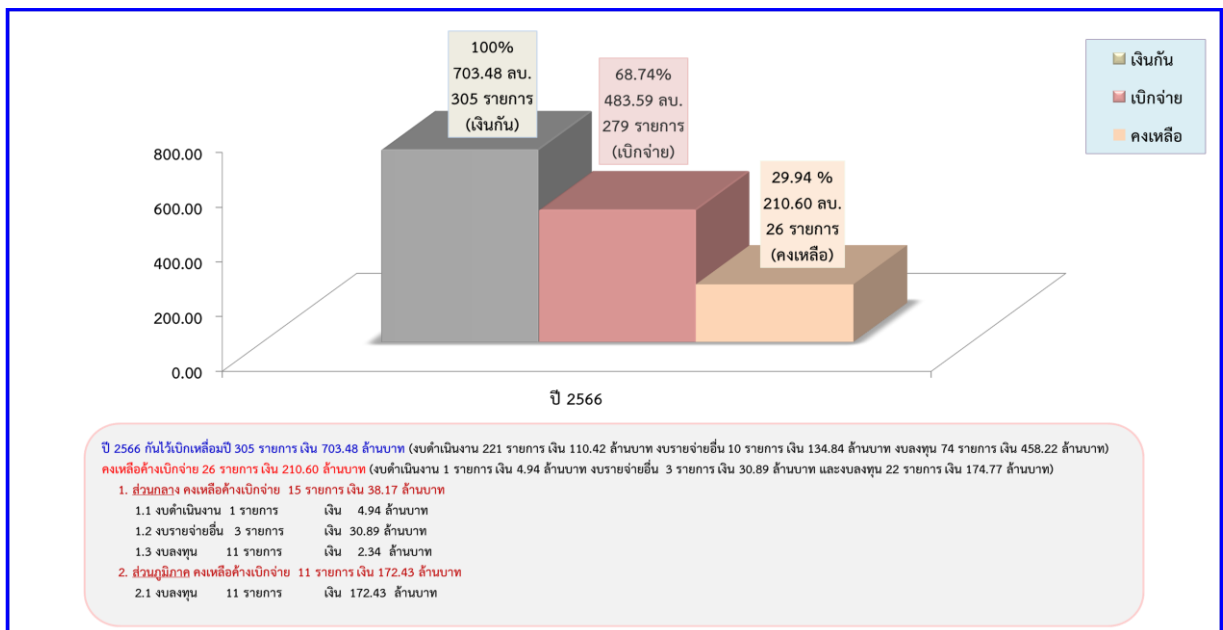

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)
รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ กองคลัง (ส่วนกลาง)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๕ รายการ เงิน ๓๘.๑๗ ล้านบาท

๔.๒.๒ กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๓ กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

รายการเงินกันฯ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ รายการ เงิน ๑๗๒.๔๓ ล้านบาท

- วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ เงิน ๑๖๗.๗๕ ล้านบาท

- วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เงิน ๔.๖๘ ล้านบาท

๔.๒.๔ กองแผนงาน (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียน...

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ **พ/ผ ๕** /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ๓. ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนปลัดเมืองพัทยา | กรรมการ |
| ๙. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |

/๑๓. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒. ให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ กท๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑๘. ผู้อำนวยการ...

๑๘. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ


๑๙. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชยาวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน



ส่วนที่สี่ บันทึกข้อความ

เลขที่	
วันที่	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา	10.00 น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท.๐๕๐๓.๕/ ๒๔๕๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		
	๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)	- ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จากกรมที่ดินแล้ว ให้เร่งทำสัญญา และเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
		- จังหวัดที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (๑๘ จังหวัด) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสาร ยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กองแผนงาน โดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรคให้ รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้ กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชนคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายขวัญชัย อธิญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ของรัฐ	กรรมการ
๔. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕. นางแมนเขียน เชาวศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๖. นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๗. นางสาวปฐิมา ท่าทราย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๘. นางชุติมา ศูนย์ะคณิต	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๙. นายทศพร มิตรนิยตม	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๐. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๒. นางสาวนงค์พาง เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นายพัฒนพนธ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๔. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๕. นายสยาม บุญมัย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวรัศมี ศรีมงคล	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนกรณ สกฤทิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๒. นายธนวัฒน์ พิศดารักษ์	เลขานุการกรม
๓. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๔. นายอนุวัฒน์ วราวุฒิจิตร	นายช่างรังวัดชำนาญงาน (สนส.)
๕. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๖. นายสุธี สุธีรัตนานนท์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๗. นางสาวพาฝัน ปิงยศ	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๘. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๙. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (สจร.)
๑๐. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๑๑. นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล	นายช่างรังวัดอาวุโส (สนส.)
๑๒. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑๓. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.) |
| ๑๔. นางสาววิภาพร จันยุทา | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สขอ.) |
| ๑๕. นางสาวยุพารัตน์ วงษา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.) |
| ๑๖. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๑๗. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.) |
| ๑๘. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๑๙. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๔ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑.๑ กำหนด...

๓.๑.๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เลขานุการ : เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน เป็นร้อยละ ๑๐๐
แบ่งออกเป็น ๔ ไตรมาส ปัจจุบันอยู่ในไตรมาสที่ ๓ และมีเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕

๓.๑.๒ แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) รายการปีเดียว ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

(๒) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการ
ดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผล
ให้กรมบัญชีกลางทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

เลขานุการ : รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๒๒๘.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย
ร้อยละ ๗๐.๓๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓,๔๐๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๒๓.๒๓ และเป้าหมายการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔๗.๖๖ ผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน ๓,๓๒๓.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๖๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๑๗.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย
ร้อยละ ๗๒.๓๓ ผลการใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๔๒.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๗.๖๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๔.๓๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๒๐๔.๐๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๕๓

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑.๒๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย
ร้อยละ ๖๑.๓๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑๖๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๕๔.๐๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๙.๐๘ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๑๙.๘๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๓.๖๖

๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ
จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๗๕ รายการ จำนวนเงิน ๔๒๘.๕๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๒๖๕.๖๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๗.๗๖ ประกอบด้วยส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๔๓.๘๒ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค
จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๑.๗๙ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้โอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๒๙๕.๔๑ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๖๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๓.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๒ และทุกจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นายพัฒน์พนธ์) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มีจำนวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๙.๐๘ ล้านบาท กักเงินจำนวน ๒๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๖.๕๐ ล้านบาท คงเหลือหลังเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๑.๙๓ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๓๐.๔๑ ล้านบาท กักเงิน จำนวน ๕๕.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๓.๙๖ ล้านบาท คงเหลือหลังเบิกจ่าย จำนวน ๖๘.๑๖ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท กักเงิน จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท คงเหลือหลังเบิกจ่าย จำนวน ๒.๐๒ ล้านบาท

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นางศุภกิจ) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีจำนวน ๓ กิจกรรม โดยทั้ง ๓ กิจกรรมมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๘๙ ซึ่งมีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจะส่ง TOR ให้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๓๕ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๘๑ มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็น ค่าบำรุงรักษา (MA) และลงพื้นที่ภาคสนามจำนวน ๓ เดือน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะดำเนินการ ใช้จ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินทั้ง ๓ กิจกรรมสูงกว่าเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นางชุตินา) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มีจำนวน ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดิน เพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เป็นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบแผนที่ การจัดทำสมุด และจัดทำฐาน ข้อมูลที่ดิน มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขต ทางสาธารณะประโยชน์ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ และ

กิจกรรม...

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่มีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย และกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด ๓ มิติฯ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๗.๙๕ เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน และการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลานาน ครบสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และบริษัทส่งมอบงาน ๒ งวดสุดท้าย เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ภายในกำหนดสัญญา ขณะนี้ได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับให้เร่งรัดดำเนินการตรวจรับ และขอความอนุเคราะห์ทางกองพัสดุ กรณีที่มีการส่งผลการตรวจรับแล้ว หากมีการแก้ไข ให้รีบแจ้งบริษัทดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และกองพัสดุ ประสานงานและวางแผนบริหารจัดการให้เบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘.๙๕ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๖.๔๓ ล้านบาท ขณะนี้จังหวัดได้ทยอยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๓.๘๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒.๓๒ ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยละ ๓๘ จังหวัดนครพนม ร้อยละ ๓๗ จังหวัดเชียงราย ร้อยละ ๒๖ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ ๓๐ และจังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๒๑ ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามแล้วเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ดำเนินงาน จะมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการฯ คงเหลือหลังเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๐.๒๓ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ เป็นค่าลูกจ้าง มีการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท เป็นการจัดฝึกอบรมสัมมนาจะมีการเบิกจ่ายเงินเพียงงวดเดียว

ประธาน : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีหลายกิจกรรม และบางกิจกรรมมีการโอนเงินงบประมาณให้จังหวัด จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามงวดงาน และหากจังหวัดมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ให้เร่งประสานงานมาส่วนกลาง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย โดยทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้จัดอบรมให้ข้าราชการของกรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้ได้มีการอบรม และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท และจะมีการอบรมเพิ่มเติมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเดือนมิถุนายนตามลำดับ เมื่อถึงกำหนดการอบรมก็จะมี การทยอยเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นการซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินฯ เป็นการจ้างลูกจ้างในสำนักงานที่ดินจังหวัด และได้มีการโอนเงินงบประมาณไปให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online เป็นค่าเดินทางไปราชการ และค่าตรวจติดตามงานของผู้บริหาร มีการทยอยเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาโครงการ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐๔.๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้าสารบบฯ

จำนวน ๔๘๐ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้ส่ง TOR ให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศ TOR คาดว่า จะทำสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการพิจารณา ส่งให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ให้ติดตามเร่งรัดกิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ ที่ได้รับงบประมาณ จำนวนมาก แต่ยังอยู่ระหว่างประกาศ TOR และในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะต้องเข้า คณะกรรมการ ICT หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของกรมที่ดินแล้ว จำนวน ๒ รายการ และรอเข้าคณะกรรมการพิจารณา ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๗ รายการ

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวน) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม มีกิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ เป็นการโอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานที่ดินดำเนินการ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานฯ มีการยกเลิก ประกาศประกวดราคาเนื่องจากได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และทำการประกวดราคา ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒ ใน ๓ ซึ่งกองพัสดุมีความเห็นว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ให้ยกเลิก การประกวดราคา และรอบงบประมาณปี ๒๕๖๗ แล้วจึงเริ่มกระบวนการใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ครบกำหนดเปิดซองประกวดราคาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : กองแผนงานมี ๒ กิจกรรม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน เป็นการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ใหม่ต้องได้ผู้รับจ้างก่อน จึงจะสามารถโอนเงินงบประมาณให้ได้ มีการโอนรอบแรก จำนวนเงิน ๔๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรม

(นายธนวัฒน์) : สำนักงานเลขานุการกรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมคลินิกที่ดินปันสุข งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ได้มีการโอนงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ขอการสนับสนุน จำนวน ๑๓ จังหวัด เป็นค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ จำนวนเงิน ๑.๖๐ ล้านบาท และในส่วนเงินคงเหลือมีแผนงานที่จะดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : กองพัสดุ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๒๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๖๗ เป็นการการจัดซื้อกระดาษโหนดที่ดิน อยู่ระหว่างจัดหา ตรวจสอบราคาและผู้ขายยังไม่เสนอราคา เนื่องจาก มีปัญหาในการขนส่งทางเรือ

สำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางแม่นิชนิชา) : สำนักกฎหมาย มีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อลงพื้นที่ ๔ ภาคต่ออธิบดีกรมที่ดินแล้ว เป็นการดำเนินการร่วมกันกับกองฝึกอบรม และยังไม่มีการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน โดยจะเริ่มโครงการภาคแรกในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคสุดท้าย (ภาคกลาง) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

(นายธนกร) : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรัฐวิสาหกิจ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๔๙ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐๙ กิจกรรมยกระดับข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๗.๑๗ ล้านบาท เป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการของสำนักงานที่ดินและข้าราชการรัฐวิสาหกิจร่วมกับหัวหน้าฝ่ายรัฐวิสาหกิจ โดยในที่ประชุมพิจารณาหลักสูตร อธิบดีกรมที่ดินให้ปรับแก้หลักสูตร (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) และงบประมาณที่ได้รับวงเงินบริหาร จำนวน ๕ ล้านบาท และเป็นการจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR คาดว่าจะส่งให้กองพัสดุได้ภายในสัปดาห์หน้า และกิจกรรมยกระดับข้าราชการรัฐวิสาหกิจ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒ ล้านบาท เป็นการจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิจัยเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการสอบเขตแบ่งแยกโฉนดให้กับภาคเอกชน ได้จัดส่ง TOR ให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ตรงตามแบบกองพัสดุจึงประสานงานให้แก้ไข TOR

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กองอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน เป็นการจัดซื้อลูกรัง และท่อระบายน้ำ ขณะนี้กองพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว คาดว่าจะยื่นประกวดราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเปิดซองประกวดราคาภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อขอจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นค่าน้ำมัน สำหรับใช้งานกับเครื่องจักรหนัก จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนๆ ละ ๕ - ๘ ล้านบาท

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิษณุ) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๓๓.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเงินขดเชยค่างานก่อสร้างค่า (K)

รายการที่ ๒ ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารส่วนกลาง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการ...

รายการที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๕ ล้านบาท เผยแพร่ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้วิจารณ์ ๑ ราย

รายการที่ ๔ ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลาง ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง

รายการที่ ๕ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

รายการที่ ๖ จัดพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง

รายการที่ ๗ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖.๐๙ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพ ดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๙ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน อ่าน แพล ดิจิตอลภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) จำนวน ๕ สถานี งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๘.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

รายการที่ ๑๑ ซื้ออุปกรณ์จัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) จำนวน ๑๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ตู้เก็บโฉนดที่ดิน ๔ ชั้น ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน ตู้เหล็กเก็บสารบบชนิดแฟ้มเดี่ยว รวม ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

รายการที่ ๑๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (Inkjet) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน ๑๐๐ เครื่อง งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเสนอวิจารณ์จำนวน ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๖ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน คันนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๗ ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภค รวม ๖ แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคายื่นเสนอราคา ครบกำหนดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๘ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา คาดว่าจะทำสัญญาได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๙ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา

รายการที่ ๒๐ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด รวม ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๒ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนายกระดับช่างรังวัดเอกชน เพื่อการถ่ายโอนภารกิจกิจการรังวัดและทำแผนที่ ยกเว้นการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (เฉพาะการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไข TOR และราคากลาง

เลขานุการ : คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในปีงบประมาณหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : จากการจัดทำ Timeline คาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ให้กองพัสดุวิเคราะห์ความเสี่ยง หากมีรายการที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ เสนออธิบดีกรมที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูล

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินฯ และโครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ได้โอนเงินงบประมาณให้จังหวัด ๗๔ จังหวัด จำนวนเงิน ๙.๔๖ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑ โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน ๔๑ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๙ จังหวัด และจังหวัดที่ไม่มีรายการงบลงทุน จำนวน ๒ จังหวัด

๔.๑.๒.๔ รายงาน...

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน/ส่วนภูมิภาค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ว่ารายการก่อนนี้ผูกพันต้องทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จากผลการติดตามเร่งรัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล.ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงิน ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครบกำหนดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล.๓ ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงิน ๗.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการ

รายการที่ ๓ ขยายเขตนํ้าประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงิน ๘.๐๗ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคตอบหนังสือกลับ

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง และรูปแบบรายการ

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ ขยายทอดตลาดพร้อมรถนอนอาคารบ้านพักข้าราชการ (หลังเดิม) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบ รายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงิน ๑๗.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพัก ข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๑๘.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๑๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด รายงานผลความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และจะสามารถทำสัญญาได้เมื่อใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ครบกำหนด ประกาศร่างประกวดราคาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสาขาขุนันธ์ ได้ราคากลางแล้ว จะประกาศร่าง ประกวดราคาภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการล่าช้า เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ก่อสร้าง ทำให้ได้ราคากลางล่าช้า คาดว่าทั้ง ๒ รายการ จะทำสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้เร่งรัดติดตามรายการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการฯ ของสาขาขุนันธ์ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากอาจทำสัญญาไม่ทันภายในปีงบประมาณ จะทำให้เงินตกพบได้

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : พบปัญหาจากเดิมใช้แบบแปลนของกรมที่ดิน โยธาธิการจังหวัดมีการแก้ไขรูปแบบรายการ โดยตัดบางส่วนออก เนื่องจากรูปแบบไม่สามารถลงพื้นที่ได้ โดยได้รับแจ้งจากทางโยธาธิการจังหวัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงได้มีการเตรียมติดต่อกับบริษัทเอกชนล่วงหน้าไว้แล้ว คาดว่าจะได้ราคากลางภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : กรมที่ดินมีทีมวิศวกรในการลงสำรวจพื้นที่ สามารถประสานงานได้ และหากไม่ได้ราคากลางภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ อาจทำให้เซ็นสัญญาไม่ทันภายในปีงบประมาณ ให้เร่งรัดติดตามอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายการขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าสำรวจออกแบบ และจัดทำรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และรายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตฯ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด เดิมมีบ้านพักหลังเก่า จำนวน ๓ หลัง ได้ผู้ประมูลรับซื้อแล้ว ในส่วนของการก่อสร้างได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน โดยทำควบคู่ไปกับงานรื้อถอนบ้านพักหลังเก่า คาดว่าจะได้ราคากลางภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้เร่งรัดดำเนินการและทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว และมีการปรับเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓๖๐ วัน

ประธาน : เร่งรัดติดตามให้ได้ราคากลางโดยเร็ว เพื่อจะได้เริ่มกระบวนการหาผู้รับจ้าง และทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีได้แจ้งกองแผนงาน และได้ส่งรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สถานที่ก่อสร้างเดิมให้ทางโยธาจัดทำรูปแบบรายการ และเสนอของบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยโยธาธิการจังหวัด แจ้งว่า ติดผังเมืองไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นบริเวณด้านหลังสำนักงาน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ทั้งหมด โดยได้รับการประสานงานจากสำนักงบประมาณให้จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์เพิ่มเติม ระหว่างที่ก่อสร้างเดิมและที่ก่อสร้างใหม่ และแสดงเหตุของครุภัณฑ์ว่าใช้ราคามาตรฐานหรือราคาตลาด ได้ดำเนินการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้เตรียมการประชุมรูปแบบ และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากราคากลางมีระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จึงจะเสนอผู้ว่าฯ ลงนามเห็นชอบต่อไป

ประธาน : ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และมีข้อมูลครบถ้วน ส่งให้สำนักงบประมาณ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติกี่วัน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณแล้ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ขณะนี้ยังไม่ได้เสนอให้ผู้ว่าฯ ลงนามเห็นชอบ หากอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ใช้ราคากลางเดิมที่ได้จัดทำไว้ เนื่องจากไม่เกินกำหนด ๓๐ วัน และได้เปรียบเทียบราคาครุภัณฑ์ ๒ บริษัทเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ได้ประสานกับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต คาดว่าสัปดาห์หน้าเสนอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบราคากลาง ขณะนี้ทางโยธาธิการจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดทำราคากลาง

ประธาน : ให้ประสานงานโยธาธิการจังหวัดติดตามอย่างต่อเนื่อง และจัดทำสัญญาให้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

เลขานุการ : รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณจำนวน ๔๐๘.๒๘ ล้านบาท โอนงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖.๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓๕๑.๗๙ ล้านบาท ให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งข้อมูลให้กองแผนงานดำเนินการตามขั้นตอน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : กรมที่ดินได้มีหนังสือเวียน ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้าง และทำหนังสือแจ้งกองแผนงาน เพื่อยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกองแผนงานจะทำหนังสือเสนอขออนุมัติอธิบดีกรมที่ดิน และแจ้งให้กองคลังโอนเงินงบประมาณต่อไป ขณะนี้ได้โอนครั้งที่ ๑ แล้ว

ประธาน : งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณจำนวน ๔๐๘.๒๘ ล้านบาท ซึ่งกองคลังโอนเงินงบประมาณไปบางส่วนให้จังหวัดที่ได้ผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากทั้งหมดจำนวน ๗๖ จังหวัด มีจำนวน ๑๘ จังหวัด ที่ยังไม่ได้แจ้งให้กรมที่ดินทราบ ให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการแจ้งยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว เพื่อกรมที่ดินจะได้โอนเงินงบประมาณต่อไป

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๖ รายการ เงิน ๔๓.๘๒ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๖ รายการ ประกอบด้วย ๖ สำนัก/กอง รายการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายการจางนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑ รายการ และทุกรายการ มีผลการเบิกเงินจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) ยกเว้น รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติ รวม ๑๑ รายการ

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของส่วนกลาง ดังนี้ รายการที่ ๑ จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แฟ้ม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว คงเหลือ ๑ งวดงาน คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

รายการ...

รายการที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปร ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท คงเหลืองานงวดที่ ๓ จำนวน ๑.๓๙ ล้านบาท และงวดที่ ๔ จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๙.๖๘ ล้านบาท คงเหลืองานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๔.๘๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒

รายการที่ ๕ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓ งวดงาน จำนวน ๑๕.๑๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการส่งมอบงานครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข การส่งมอบงาน ครั้งที่ ๔

รายการที่ ๖ ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๗๖ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ รายการ เงิน ๒๒๑.๗๙ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ จังหวัดชลบุรี สาขางดละมัง จังหวัดปัตตานี และส่วนที่เหลือที่มีการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินฯ มีผลการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๒.๔๔ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๖.๓๖ ล้านบาท

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : งบลงทุนวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ จังหวัด รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑๙ งวดงาน ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ขณะนี้มีปัญหา อุปสรรค ในการก่อสร้างหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ เป็นการเทพื้นชั้นล่าง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งเบิกเงินงวดที่ ๓ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินงานต่อในงวดที่ ๔ เป็นการขึ้นโครงหลังคา ปัญหาและอุปสรรคการก่อสร้างเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคมมีความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐ คืบหน้าจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ ๒๘ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีผลการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๙.๐๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ดำเนินงานงวดที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อผนัง ในส่วนงานห้องน้ำประชาชน ศาลาที่พักประชาชน และผนังชั้นที่ ๑ โดยจะขึ้นโครงหลังคาได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในงวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๐ เป็นงานรั้ว พื้นคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ควบคู่กัน คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : ผู้รับจ้างดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๙ - งวดที่ ๑๒ ควบคู่กัน ซึ่งเป็นงานด้านโครงสร้างหลัก เป็นงานด้านสถาปัตยกรรม และงานวางระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวดงาน คงเหลือ ๑๐ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๙ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ตามแผนงานก่อสร้างกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๕๒.๖๗ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ข้างกว่าแผนงานที่กำหนดเป้าหมายไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗ ขณะนี้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินรวม จำนวน ๑๓.๓๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงวดงานที่ ๗ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จังหวัดได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดงานของผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : ความคืบหน้าของผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับจ้างติดปัญหา อุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : เนื่องจากต้องรื้อถอนอาคารเก่า และขายทอดตลาดก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารจากราคากลาง จำนวน ๔๖ ล้านบาท ประกอบกับผู้รับจ้างประกวดราคาในวงเงินจำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท และปัจจุบันค่าวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ขณะนี้ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทันตามแผนงานแล้ว

ประธาน : เนื่องจากมีความคืบหน้าน้อย และผู้รับจ้างประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางให้ติดตามเป็นกรณีพิเศษ เพราะมีผลการเบิกจ่ายเงินไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และใกล้สิ้นปีงบประมาณ และอาจทำให้เงินตกพบได้

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑๗ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑.๘๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๔ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมติดตามเร่งรัดงานกับผู้รับจ้าง (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้างจะเพิ่มคนงานจาก ๓๐ คน เป็น ๔๐ คน คาดว่าจะส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ผลงานมีความคืบหน้า ให้เร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เพื่อจะได้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวดงาน คงเหลือ ๑๙ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ผลงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๒ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานจำนวน ๖ งวดงาน คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ ๕๔ และไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด โดยจะติดตามเร่งรัดและควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

ประธาน : ความคืบหน้าของผลงานค่อนข้างน้อย โครงสร้างหลักยังไม่เรียบร้อย หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ให้เร่งรัดการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑ งวดงาน คงเหลือ ๗ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๖ และผลงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ผลงานสะสมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๙ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒ และงวดที่ ๑๓ ควบคุมกันและได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแต่ละงวดงานให้เสร็จ เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้ตรงตามงวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ และงวดที่ ๑๓ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นงานในส่วนโรงจอดรถ และการเทพื้นรอบอาคาร ดำเนินการใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ให้แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินงานที่ละงวดงาน เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินตรงตามงวด เพราะหากดำเนินการในแต่ละงวดงานไม่แล้วเสร็จ จะทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานได้ และคาดว่าจะเสร็จทันภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : คาดว่าเสร็จทันภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยได้กำชับกับผู้รับจ้างแล้วและมีการลงพื้นที่ตรวจงานทุกสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน คงเหลือ ๙ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖.๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๗ รวมเป็นร้อยละ ๓๖.๘๙ ผลงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๕ รวมเป็นร้อยละ ๖๑ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนช่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จไม่ทันตามสัญญา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากงานมีรายละเอียดด้านในอาคารยังไม่สมบูรณ์ แต่สั่งซื้อเคาน์เตอร์ และโต๊ะทำงานไว้แล้วซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ภายในสัปดาห์หน้า

ประธาน : ผลงานกับผลการเบิกจ่ายเงินไม่สัมพันธ์กัน ให้ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงวดงานเป็นงวด เพื่อจะได้ตรวจรับและทยอยเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามงวด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมาฯ) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขางบละมุง วงเงินตามสัญญา ๖๘.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๓ งวดงาน คงเหลือ ๕ งวดงาน ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๖.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ขณะนี้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบทุกงวดภายในสัปดาห์หน้า

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมาฯ) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘ งวดงาน คงเหลือ ๔ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๖๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙ งวดงาน มีการขยายสัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยงวดงานที่ ๙ เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และงวดที่ ๑๐ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ จะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบภายในกำหนดสัญญา

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี คงเหลือ ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุทัยธานี

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑.๖๙ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการจึงแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน และได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา ครบกำหนดประกาศแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างมาเสนอราคา จึงขออนุมัติใช้วิธีคัดเลือก ครบกำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้เสนอราคา จำนวน ๕ ราย คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานในส่วนการปรับปรุงพื้นที่รั้ว ประตูสแตนเลส ปลุกต้นไม้โดยรอบอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

ประธาน...

ประธาน : คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐๐ วัน ถ้าหากได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรธานี สาขากุมภวาปี ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และความคืบหน้าของผลงาน และผลการเบิกจ่ายเงินค่อนข้างน้อย มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรธานี : สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากผู้รับจ้างทำงาน จึงต้องทำการ e - bidding ใหม่ โดยการดำเนินงานงวดที่ ๑ ล่าช้าเนื่องจากต้องเจาะเสาเข็มใหม่จำนวน ๔๒ ต้น ซึ่งผู้รับจ้างรายแรกทำได้เพียงจำนวน ๖ ต้น จากเสาเข็มทั้งหมด จำนวน ๔๘ ต้น มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และจากการประชุมติดตามเร่งรัดร่วมกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ แต่ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินอาจจะไม่เป็นไปตามงวดงาน ได้มีการติดตามงาน โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขากุมภวาปี ส่งรูปภาพงาน และแจ้งจำนวนคนงาน รายงานให้ทราบเป็นประจำทุกวัน รวมถึงความคืบหน้าของผลงาน ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ผลงานอยู่ที่ร้อยละ ๓๒ และอยู่ระหว่างวางแบบชั้น ๒ การผูกเหล็ก วางพื้น และเทพื้นบริเวณชั้นที่ ๒ ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในกำหนด

ประธาน : การประชุมครั้งหน้าขอภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน และช่วยเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามงวดงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จากกรมที่ดินแล้ว ให้เร่งทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินโดยเร็วและจังหวัดที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (๑๘ จังหวัด) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างและส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนงานโดยเร็ว

๓. ให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน

๔. ให้สำนัก...

๔. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งให้รายงาน ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชโลก แดงอ่อน
(นางสาวชนิดา แดงอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

กมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร
(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มิ.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 82 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 58 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ปทุมธานี	5,149,280.00	4,868,517.55	94.55	4,856,082.30	94.31	12.55	36.31	280,762.45	5.45
2.	สมุทรปราการ	4,244,780.00	3,633,235.49	85.59	3,633,235.49	85.59	3.59	27.59	611,544.51	14.41
3.	นนทบุรี	4,304,680.00	3,591,795.73	83.44	3,591,795.73	83.44	1.44	25.44	712,884.27	16.56
4.	นครนายก	2,441,920.00	2,028,087.65	83.05	2,016,087.65	82.56	1.05	24.56	413,832.35	16.95
5.	สตูล	2,755,604.00	2,285,150.95	82.93	2,273,150.95	82.49	0.93	24.49	470,453.05	17.07
6.	สุพรรณบุรี	7,384,100.00	6,042,347.06	81.83	6,024,347.06	81.59	(0.17)	23.59	1,341,752.94	18.17
7.	ชุมพร	4,804,720.00	3,934,186.42	81.88	3,919,186.42	81.57	(0.12)	23.57	870,533.58	18.12
8.	ประจวบคีรีขันธ์	3,697,270.00	3,006,341.05	81.31	3,006,341.05	81.31	(0.69)	23.31	690,928.95	18.69
9.	สมุทรสาคร	2,952,720.00	2,418,750.44	81.92	2,394,750.44	81.10	(0.08)	23.10	533,969.56	18.08
10.	เพชรบุรี	4,543,620.00	3,670,221.73	80.78	3,670,221.73	80.78	(1.22)	22.78	873,398.27	19.22
11.	ภูเก็ต	2,273,436.00	1,821,785.77	80.13	1,821,785.77	80.13	(1.87)	22.13	451,650.23	19.87
12.	ลำปาง	8,662,611.00	6,913,715.37	79.81	6,913,715.37	79.81	(2.19)	21.81	1,748,895.63	20.19
13.	ตราด	2,399,129.00	1,892,302.98	78.87	1,892,302.98	78.87	(3.13)	20.87	506,826.02	21.13
14.	กำแพงเพชร	3,777,017.10	2,967,068.72	78.56	2,967,068.72	78.56	(3.44)	20.56	809,948.38	21.44
15.	นครศรีธรรมราช	11,323,480.00	8,912,033.84	78.70	8,879,033.84	78.41	(3.30)	20.41	2,411,446.16	21.30
16.	กาญจนบุรี	6,666,879.00	5,216,710.73	78.25	5,216,710.73	78.25	(3.75)	20.25	1,450,168.27	21.75
17.	สุโขทัย	4,902,955.00	3,833,320.61	78.18	3,833,320.61	78.18	(3.82)	20.18	1,069,634.39	21.82
18.	หนองบัวลำภู	2,408,170.00	1,875,895.98	77.90	1,875,895.98	77.90	(4.10)	19.90	532,274.02	22.10
19.	พัทลุง	3,730,858.00	2,925,505.63	78.41	2,905,505.63	77.88	(3.59)	19.88	805,352.37	21.59
20.	ฉะเชิงเทรา	4,472,022.60	3,496,104.08	78.18	3,481,704.08	77.86	(3.82)	19.86	975,918.52	21.82
21.	อุบลราชธานี	10,414,422.00	8,097,150.63	77.75	8,094,054.93	77.72	(4.25)	19.72	2,317,271.37	22.25
22.	หนองคาย	4,085,548.00	3,167,996.55	77.54	3,167,996.55	77.54	(4.46)	19.54	917,551.45	22.46
23.	ราชบุรี	5,014,420.00	3,873,172.04	77.24	3,873,172.04	77.24	(4.76)	19.24	1,141,247.96	22.76
24.	ระนอง	1,583,147.60	1,218,562.18	76.97	1,218,562.18	76.97	(5.03)	18.97	364,585.42	23.03
25.	สกลนคร	6,592,270.00	5,067,786.71	76.87	5,067,786.71	76.87	(5.13)	18.87	1,524,483.29	23.13
26.	ชลบุรี	8,366,151.50	6,418,605.83	76.72	6,418,605.83	76.72	(5.28)	18.72	1,947,545.67	23.28
27.	อำนาจเจริญ	2,882,767.00	2,209,336.57	76.64	2,209,336.57	76.64	(5.36)	18.64	673,430.43	23.36
28.	ระยอง	5,874,176.00	4,492,520.36	76.48	4,492,520.36	76.48	(5.52)	18.48	1,381,655.64	23.52
29.	บึงกาฬ	2,566,424.00	1,960,089.42	76.37	1,960,089.42	76.37	(5.63)	18.37	606,334.58	23.63
30.	เพชรบูรณ์	6,421,184.16	4,898,408.59	76.29	4,898,408.59	76.29	(5.71)	18.29	1,522,775.57	23.71
31.	อุดรธานี	9,082,470.00	6,927,148.22	76.27	6,927,148.22	76.27	(5.73)	18.27	2,155,321.78	23.73
32.	ลำพูน	4,510,709.00	3,509,927.60	77.81	3,436,927.60	76.19	(4.19)	18.19	1,000,781.40	22.19
33.	พระนครศรีอยุธยา	5,768,715.00	4,386,597.43	76.04	4,386,597.43	76.04	(5.96)	18.04	1,382,117.57	23.96
34.	ลพบุรี	5,268,996.00	4,004,622.94	76.00	3,999,422.94	75.90	(6.00)	17.90	1,264,373.06	24.00
35.	เชียงใหม่	12,957,282.31	9,786,302.72	75.53	9,786,302.72	75.53	(6.47)	17.53	3,170,979.59	24.47
36.	พิจิตร	5,146,300.00	3,879,777.04	75.39	3,879,777.04	75.39	(6.61)	17.39	1,266,522.96	24.61
37.	ยโสธร	4,065,006.00	3,085,390.75	75.90	3,062,390.75	75.34	(6.10)	17.34	979,615.25	24.10
38.	แพร่	4,578,588.00	3,504,619.55	76.54	3,444,619.55	75.23	(5.46)	17.23	1,073,968.45	23.46
39.	สิงห์บุรี	1,699,240.00	1,316,780.97	77.49	1,276,420.97	75.12	(4.51)	17.12	382,459.03	22.51
40.	ตรัง	5,761,127.43	4,383,509.78	76.09	4,323,509.78	75.05	(5.91)	17.05	1,377,617.65	23.91
41.	ชัยภูมิ	7,711,927.00	5,785,392.24	75.02	5,785,392.24	75.02	(6.98)	17.02	1,926,534.76	24.98

เอกสารหมายเลข 1

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มิ.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 82 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 58 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
42.	สระแก้ว	2,599,110.00	1,948,648.35	74.97	1,948,648.35	74.97	(7.03)	16.97	650,461.65	25.03
43.	อุดรดิตถ์	3,555,311.00	2,622,245.68	73.76	2,622,245.68	73.76	(8.24)	15.76	933,065.32	26.24
44.	ตาก	3,408,137.00	2,507,380.63	73.57	2,507,380.63	73.57	(8.43)	15.57	900,756.37	26.43
45.	ชัยนาท	3,837,609.21	2,830,993.97	73.77	2,818,993.97	73.46	(8.23)	15.46	1,006,615.24	26.23
46.	พะเยา	5,953,647.00	4,361,041.92	73.25	4,361,041.92	73.25	(8.75)	15.25	1,592,605.08	26.75
47.	กาฬสินธุ์	5,359,170.00	3,924,388.81	73.23	3,924,388.81	73.23	(8.77)	15.23	1,434,781.19	26.77
48.	สมุทรสงคราม	1,140,245.00	846,833.97	74.27	834,833.97	73.22	(7.73)	15.22	293,411.03	25.73
49.	นครสวรรค์	7,768,250.00	5,674,179.34	73.04	5,674,179.34	73.04	(8.96)	15.04	2,094,070.66	26.96
50.	สงขลา	13,377,772.88	9,930,535.06	74.23	9,754,035.06	72.91	(7.77)	14.91	3,447,237.82	25.77
51.	ยะลา	5,649,977.00	4,112,556.17	72.79	4,102,156.17	72.60	(9.21)	14.60	1,537,420.83	27.21
52.	น่าน	4,884,859.32	3,691,234.27	75.56	3,538,434.27	72.44	(6.44)	14.44	1,193,625.05	24.44
53.	ปราจีนบุรี	3,352,070.00	2,430,125.41	72.50	2,425,915.41	72.37	(9.50)	14.37	921,944.59	27.50
54.	นครพนม	6,504,246.00	4,698,365.92	72.24	4,698,365.92	72.24	(9.76)	14.24	1,805,880.08	27.76
55.	ปัตตานี	6,839,930.00	4,943,486.25	72.27	4,938,286.25	72.20	(9.73)	14.20	1,896,443.75	27.73
56.	พิษณุโลก	6,516,341.32	4,695,689.55	72.06	4,685,289.55	71.90	(9.94)	13.90	1,820,651.77	27.94
57.	พังงา	3,960,110.00	2,861,819.35	72.27	2,833,661.67	71.56	(9.73)	13.56	1,098,290.65	27.73
58.	มหาสารคาม	6,694,543.00	4,785,990.91	71.49	4,785,990.91	71.49	(10.51)	13.49	1,908,552.09	28.51
59.	นครปฐม	5,330,605.00	3,762,907.61	70.59	3,762,907.61	70.59	(11.41)	12.59	1,567,697.39	29.41
60.	เชียงราย	10,784,272.63	7,565,168.34	70.15	7,565,168.34	70.15	(11.85)	12.15	3,219,104.29	29.85
61.	จันทบุรี	4,820,832.00	3,424,822.24	71.04	3,380,822.24	70.13	(10.96)	12.13	1,396,009.76	28.96
62.	ขอนแก่น	12,184,141.00	8,490,561.61	69.69	8,490,561.61	69.69	(12.31)	11.69	3,693,579.39	30.31
63.	สุรินทร์	8,669,954.17	6,037,402.14	69.64	6,037,402.14	69.64	(12.36)	11.64	2,632,552.03	30.36
64.	เลย	5,530,730.00	3,833,636.96	69.32	3,833,636.96	69.32	(12.68)	11.32	1,697,093.04	30.68
65.	สุราษฎร์ธานี	8,522,280.64	5,988,037.26	70.26	5,883,037.26	69.03	(11.74)	11.03	2,534,243.38	29.74
66.	อุทัยธานี	3,273,529.00	2,249,587.40	68.72	2,249,587.40	68.72	(13.28)	10.72	1,023,941.60	31.28
67.	บุรีรัมย์	8,205,340.00	5,629,850.28	68.61	5,619,850.28	68.49	(13.39)	10.49	2,575,489.72	31.39
68.	อ่างทอง	1,716,940.00	1,168,366.71	68.05	1,168,366.71	68.05	(13.95)	10.05	548,573.29	31.95
69.	นราธิวาส	7,487,111.39	5,176,045.07	69.13	5,077,833.07	67.82	(12.87)	9.82	2,311,066.32	30.87
70.	ร้อยเอ็ด	9,417,173.00	6,354,711.71	67.48	6,354,711.71	67.48	(14.52)	9.48	3,062,461.29	32.52
71.	นครราชสีมา	18,055,466.00	12,320,199.74	68.24	12,075,554.83	66.88	(13.76)	8.88	5,735,266.26	31.76
72.	ศรีสะเกษ	7,731,959.00	5,219,837.64	67.51	5,156,643.74	66.69	(14.49)	8.69	2,512,121.36	32.49
73.	มุกดาหาร	2,467,281.36	1,632,111.90	66.15	1,632,111.90	66.15	(15.85)	8.15	835,169.46	33.85
74.	กระบี่	4,205,490.00	2,950,095.49	70.15	2,775,245.49	65.99	(11.85)	7.99	1,255,394.51	29.85
75.	แม่ฮ่องสอน	2,697,887.24	1,747,754.03	64.78	1,747,754.03	64.78	(17.22)	6.78	950,133.21	35.22
76.	สระบุรี	4,662,506.00	2,854,883.62	61.23	2,854,883.62	61.23	(20.77)	3.23	1,807,622.38	38.77
รวมทั้งสิ้น		430,410,949.86	320,578,271.21	74.48	319,001,211.77	74.12	(7.52)	16.12	109,832,678.65	25.52

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 76 จังหวัด

2. จัดสรรเงินรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 2.1 ได้รับเงินงวดที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนลูกจ้างประจำ งานธุรการเก็บเอกสารห้องสารบบ งานบันทึกข้อมูล 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทำความสะอาด) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด (6 เดือน)
- 2.2 จัดสรรตามที่สำนัก/กองแจ้ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดฯ ค่าเรือถอน ค่าขนย้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ค่าหลักเขตที่ดินและเหตุหลักฐานแผนที่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างกำจัดปลวก

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังหัก (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	196,572,600.00	9,460,330.00	187,112,270.00	102,616,497.65	54.84	95,276,970.16	50.92	84,495,772.35					91,835,299.84
	- กิจกรรม : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	49,083,200.00	846,000.00	48,237,200.00	30,319,127.13	62.85	29,979,221.13	62.15	17,918,072.87	80.00	(17.15)	21.00	41.15	18,257,978.87
	- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	130,409,500.00	8,284,830.00	122,124,670.00	67,395,390.23	55.19	61,050,475.22	49.99	54,729,279.77	80.00	(24.81)	21.00	28.99	61,074,194.78
	: วงเงินบริหาร	14,489,900.00	329,500.00	14,160,400.00	4,003,120.42	28.27	3,888,725.42	27.46	10,157,279.58					10,271,674.58
	- กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกลิน (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	2,331,000.00	-	2,331,000.00	898,859.87	38.56	358,548.39	15.38	1,432,140.13	80.00	(41.44)	21.00	(5.62)	1,972,451.61
	: วงเงินบริหาร	259,000.00	-	259,000.00	-	-	-	0.00	259,000.00					259,000.00
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	59,642,300.00	-	59,642,300.00	27,399,548.28	45.94	21,573,866.97	36.17	32,242,751.72					38,068,433.03
	- กิจกรรม : จัดสร้างและให้บริการระวาง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)	38,037,900.00	-	38,037,900.00	19,729,254.07	51.87	15,381,812.76	40.44	18,308,645.93	80.00	(28.13)	21.00	19.44	22,656,087.24
	: วงเงินบริหาร	2,559,800.00	-	2,559,800.00	-		-		2,559,800.00					2,559,800.00
	- กิจกรรม : ปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	4,781,000.00	-	4,781,000.00	3,012,774.21	63.02	3,012,774.21	63.02	1,768,225.79	80.00	(16.98)	21.00	42.02	1,768,225.79
	- กิจกรรม : บริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	12,763,600.00	-	12,763,600.00	4,657,520.00	36.49	3,179,280.00	24.91	8,106,080.00	80.00	(43.51)	21.00	3.91	9,584,320.00
	: วงเงินบริหาร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	0.00	1,500,000.00					1,500,000.00
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	29,881,500.00	-	29,881,500.00	8,931,306.29	29.89	7,673,766.94	25.68	20,950,193.71					22,207,733.06
	- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล : วงเงินบริหาร	1,950,000.00	-	1,950,000.00	1,028,612.70	52.75	1,028,612.70	52.75	921,387.30	82.00	(29.25)	58.00	(5.25)	921,387.30
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	4,191,700.00	-	4,191,700.00	2,479,354.15	59.15	2,255,874.15	53.82	1,712,345.85	80.00	(20.85)	21.00	32.82	1,935,825.85

[illegible]

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งบป.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งบป.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5	สำนัก / กอง													
5.1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	555,775,700.00	24,140,160.00	531,635,540.00	12,830,820.52	2.41	10,154,628.42	1.91	518,804,719.48					521,480,911.58
	- กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ (แผนงานบูรณาการดิจิทัล)	446,500.00	-	446,500.00	285,800.00	64.01	228,600.00	51.20	160,700.00	82.00	(17.99)	58.00	(6.80)	217,900.00
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	9,711,800.00	-	9,711,800.00	9,280,566.92	95.56	8,012,470.82	82.50	431,233.08	82.00	13.56	58.00	24.50	1,699,329.18
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย	36,296,800.00	24,140,160.00	12,156,640.00	1,539,239.30	12.66	1,508,343.30	12.41	10,617,400.70	82.00	(69.34)	58.00	(45.59)	10,648,296.70
	- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดิน	448,600.00	-	448,600.00	405,214.30	90.33	405,214.30	90.33	43,385.70	82.00	8.33	58.00	32.33	43,385.70
	อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online													
	- กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดิน	504,872,000.00	-	504,872,000.00	-	-	-	0.00	504,872,000.00	80.00	(80.00)	21.00	(21.00)	504,872,000.00
	อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	- กิจกรรม : จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,320,000.00	33.00	-	0.00	2,680,000.00	82.00	(49.00)	58.00	(58.00)	4,000,000.00
	เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย													
	ทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน													
5.2	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	49,561,900.00	23,414,400.00	26,147,500.00	1,628,713.79	6.23	1,163,334.40	4.45	24,518,786.21					24,984,165.60
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน	318,400.00	-	318,400.00	303,162.79	95.21	177,783.40	55.84	15,237.21	82.00	13.21	58.00	(2.16)	140,616.60
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	1,099,500.00		1,099,500.00	985,551.00	89.64	985,551.00	89.64	113,949.00	82.00	7.64	58.00	31.64	113,949.00
	- กิจกรรม : จัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ	24,000,000.00	23,414,400.00	585,600.00	340,000.00	58.06	-	0.00	245,600.00	82.00	(23.94)	58.00	(58.00)	585,600.00
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานฯ (งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)	24,144,000.00	-	24,144,000.00	-	-	-	0.00	24,144,000.00	80.00	(80.00)	21.00	(21.00)	24,144,000.00
5.3	กองแผนงาน	42,447,955.00	29,068,960.00	13,378,995.00	1,159,304.11	8.67	1,118,041.96	8.36	12,219,690.89					12,260,953.04
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	1,177,135.00	-	1,177,135.00	669,990.11	56.92	628,727.96	53.41	507,144.89	82.00	(25.08)	58.00	(4.59)	548,407.04
	- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐาน	41,270,820.00	29,068,960.00	12,201,860.00	489,314.00	4.01	489,314.00	4.01	11,712,546.00	82.00	(77.99)	58.00	(53.99)	11,712,546.00
	ทางทะเบียนที่ดิน													
5.4	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	1,962,000.00	-	1,962,000.00	1,294,315.75	65.97	1,324,073.75	67.49	667,684.25	82.00	(16.03)	58.00	9.49	637,926.25
5.5	กองฝึกอบรม	2,314,400.00	73,200.00	2,241,200.00	1,344,531.65	59.99	1,066,126.05	47.57	896,668.35	82.00	(22.01)	58.00	(10.43)	1,175,073.95
5.6	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	981,000.00	-	981,000.00	644,175.00	65.67	457,184.68	46.60	336,825.00	82.00	(16.33)	58.00	(11.40)	523,815.32
5.7	สำนักส่งเสริมธุรกิจสิ่งทวียมทรัพย์	690,902.93	-	690,902.93	690,238.93	99.90	596,136.23	86.28	664.00	82.00	17.90	58.00	28.28	94,766.70
5.8	กองพัสดุ	3,515,300.00	-	3,515,300.00	1,188,530.27	33.81	1,094,727.42	31.14	2,326,769.73	82.00	(48.19)	58.00	(26.86)	2,420,572.58
5.9	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน	5,521,750.00	1,603,185.00	3,918,565.00	2,777,929.07	70.89	1,603,572.09	40.92	1,140,635.93					2,314,992.91
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	2,821,750.00	-	2,821,750.00	2,260,659.07	80.12	1,603,572.09	56.83	561,090.93	82.00	(1.88)	58.00	(1.17)	1,218,177.91
	- กิจกรรม : คลินิกที่ดินปันสุข	2,700,000.00	1,603,185.00	1,096,815.00	517,270.00	47.16	-	0.00	579,545.00	82.00	(34.84)	58.00	(58.00)	1,096,815.00
	: วงเงินบริหาร	300,000.00	-	300,000.00	-	0.00	-	0.00	300,000.00		0.00		0.00	300,000.00

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	งปม.ที่ได้รับ (1)	โอนภูมิภาค (2)	งปม.ที่ได้รับ หลังโอน (3) = (1) - (2)	ก้นเงิน (4)		เบิกจ่าย (5)		คงเหลือ หลังกัน (6) = (3) - (4)	เป้าหมายการใช้จ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย		คงเหลือ หลังเบิกจ่าย (7) = (3) - (5)
					ทำสัญญา	%	จำนวนเงิน	%		เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	เดือน มิ.ย.67	สูง(ต่ำ)กว่า ร้อยละ	
5.10	กองคลัง	658,200.00	-	658,200.00	356,698.84	54.19	299,247.29	45.46	301,501.16	82.00	(27.81)	58.00	(12.54)	358,952.71
5.11	กองการเจ้าหน้าที่	1,170,118.03	-	1,170,118.03	1,141,087.37	97.52	895,448.03	76.53	29,030.66	82.00	15.52	58.00	18.53	274,670.00
5.12	กองการพิมพ์	370,200.00	-	370,200.00	287,280.89	77.60	202,760.89	54.77	82,919.11	82.00	(4.40)	58.00	(3.23)	167,439.11
5.13	สำนักกฎหมาย	4,071,200.00	719,500.00	3,351,700.00	2,982,710.94	88.99	1,056,039.64	31.51	368,989.06					2,295,660.36
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	450,700.00	-	450,700.00	270,089.94	59.93	258,739.64	57.41	180,610.06	82.00	(22.07)	58.00	(0.59)	191,960.36
	- กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น	3,620,500.00	719,500.00	2,901,000.00	2,712,621.00	93.51	797,300.00	27.48	188,379.00	82.00	11.51	58.00	(30.52)	2,103,700.00
	ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน													
5.14	กลุ่มตรวจสอบภายใน	524,900.00	-	524,900.00	282,015.00	53.73	282,015.00	53.73	242,885.00	82.00	(28.27)	58.00	(4.27)	242,885.00
5.15	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	212,800.00	-	212,800.00	144,425.65	67.87	92,984.05	43.70	68,374.35	82.00	(14.13)	58.00	(14.30)	119,815.95
5.16	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	158,250.00	-	158,250.00	147,064.41	92.93	138,023.66	87.22	11,185.59	82.00	10.93	58.00	29.22	20,226.34
5.17	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	202,200.00	-	202,200.00	112,217.50	55.50	138,023.66	68.26	89,982.50	82.00	(26.50)	58.00	10.26	64,176.34
5.18	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	7,447,100.00	-	7,447,100.00	200,662.40	2.69	137,007.40	1.84	7,246,437.60					7,310,092.60
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน	273,300.00	-	273,300.00	200,662.40	73.42	137,007.40	50.13	72,637.60	82.00	(8.58)	58.00	(7.87)	136,292.60
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	7,173,800.00	-	7,173,800.00		-		0.00	7,173,800.00	80.00	(80.00)	21.00	(21.00)	7,173,800.00
	(งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายลงทุน)													
	: วงเงินบริหาร	5,000,000.00	356,000.00	4,644,000.00	1,070,749.08	23.06	987,460.00	21.26	3,573,250.92					3,656,540.00
	- กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ	2,000,000.00	-	2,000,000.00		-		0.00	2,000,000.00	80.00	(80.00)	21.00	(21.00)	2,000,000.00
	(งบรายจ่ายอื่น เป็นรายจ่ายลงทุน)													
6.1	ส.กท.ม.	354,700.00	-	354,700.00	303,178.69	85.47	165,068.51	46.54	51,521.31	82.00	3.47	58.00	(11.46)	189,631.49
6.2	ส.กท.ม. สาขาบางเขน	365,600.00	-	365,600.00	245,960.20	67.28	154,172.43	42.17	119,639.80	82.00	(14.72)	58.00	(15.83)	211,427.57
6.3	ส.กท.ม. สาขาพระโขนง	246,700.00	-	246,700.00	143,084.05	58.00	143,084.05	58.00	103,615.95	82.00	(24.00)	58.00	(0.00)	103,615.95
6.4	ส.กท.ม. สาขาบางกะปิ	282,700.00	-	282,700.00	173,774.76	61.47	111,626.16	39.49	108,925.24	82.00	(20.53)	58.00	(18.51)	171,073.84
6.5	ส.กท.ม. สาขาบางกอกน้อย	365,620.00	-	365,620.00	254,377.78	69.57	197,128.13	53.92	111,242.22	82.00	(12.43)	58.00	(4.08)	168,491.87
6.6	ส.กท.ม. สาขาธนบุรี	448,540.00	-	448,540.00	269,379.01	60.06	222,756.61	49.66	179,160.99	82.00	(21.94)	58.00	(8.34)	225,783.39
6.7	ส.กท.ม. สาขาห้วยขวาง	282,700.00	-	282,700.00	203,731.22	72.07	139,084.32	49.20	78,968.78	82.00	(9.93)	58.00	(8.80)	143,615.68
6.8	ส.กท.ม. สาขาหนองแขม	223,200.00	-	223,200.00	128,485.33	57.57	79,676.08	35.70	94,714.67	82.00	(24.43)	58.00	(22.30)	143,523.92
6.9	ส.กท.ม. สาขาลาดพร้าว	282,700.00	-	282,700.00	133,377.05	47.18	82,262.35	29.10	149,322.95	82.00	(34.82)	58.00	(28.90)	200,437.65
6.10	ส.กท.ม. สาขาดอนเมือง	346,540.00	-	346,540.00	233,537.46	67.39	189,061.91	54.56	113,002.54	82.00	(14.61)	58.00	(3.44)	157,478.09
6.11	ส.กท.ม. สาขาหนองจอก	263,620.00	-	263,620.00	219,538.78	83.28	110,746.30	42.01	44,081.22	82.00	1.28	58.00	(15.99)	152,873.70
6.12	ส.กท.ม. สาขาปทุม	263,620.00	-	263,620.00	235,523.88	89.34	144,901.20	54.97	28,096.12	82.00	7.34	58.00	(3.03)	118,718.80
6.13	ส.กท.ม. สาขาประเวศ	365,620.00	-	365,620.00	261,804.61	71.61	213,623.94	58.43	103,815.39	82.00	(10.39)	58.00	0.43	151,996.06
6.14	ส.กท.ม. สาขาลาดกระบัง	144,700.00	-	144,700.00	100,878.34	69.72	55,200.09	38.15	43,821.66	82.00	(12.28)	58.00	(19.85)	89,499.91
6.15	ส.กท.ม. สาขามีนบุรี	531,460.00	-	531,460.00	359,796.20	67.70	317,213.20	59.69	171,663.80	82.00	(14.30)	58.00	1.69	214,246.80
6.16	ส.กท.ม. สาขาบางขุนเทียน	246,700.00	-	246,700.00	159,583.50	64.69	149,632.50	60.65	87,116.50	82.00	(17.31)	58.00	2.65	97,067.50
6.17	ส.กท.ม. สาขาจตุจักร	429,460.00	-	429,460.00	269,871.75	62.84	207,088.10	48.22	159,588.25	82.00	(19.16)	58.00	(9.78)	222,371.90

ช่อง "ก้นเงิน" เก็บข้อมูลจากระบบ efnms และ ช่อง "เบิกจ่าย" เก็บข้อมูลจากสมุดคุมของกองคลัง

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	คาดว่าอนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ เชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐	๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒	๑,๗๓๖,๙๐๓.๐๐	๕,๙๖๕,๓๙๗.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๘๖๘,๔๕๓.๒๐ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๐๒,๓๐๐.๐๐	๗,๗๐๒,๒๖๕.๕๒	๑,๗๓๖,๙๐๓.๐๐	๕,๙๖๕,๓๙๗.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๘๖๘,๔๕๓.๒๐ บาท
๓) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๒,๘๘๗.๖๐	๑,๘๗๒,๓๙๑.๐๐	๖,๕๖๐,๖๐๙.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๔) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๕๙๑,๕๐๐.๐๐	๘,๕๙๑,๓๙๙.๖๐	๑,๙๙๐,๔๙๓.๔๑	๖,๖๐๑,๐๐๖.๕๙	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๕) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๘,๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๘,๔๔๑,๓๙๙.๖๐	๑,๘๖๙,๑๘๔.๐๐	๖,๕๗๒,๓๑๖.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๖) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๑๖๙,๒๐๐.๐๐	๕,๑๖๙,๐๙๘.๐๐	๒,๑๔๖,๓๒๒.๐๐	๓,๐๒๒,๘๗๘.๐๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๗) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๕,๐๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๑๙,๐๙๘.๐๐	-	๕,๐๑๙,๒๐๐.๐๐	ประมาณการเริ่มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ - บาท
๘) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๙,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๙,๑๘๔,๓๗๖.๔๐	๒,๐๒๐,๑๗๖.๑๐	๗,๑๖๔,๓๒๓.๙๐	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๙) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๑๘๐,๗๐๐.๐๐	๘,๑๘๐,๕๑๖.๔๐	๑,๙๘๕,๕๕๐.๓๑	๖,๑๙๕,๑๔๙.๖๙	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๙๘,๖๓๖.๐๐ บาท
๑๐) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	๘,๐๑๘,๕๐๐.๐๐	๘,๐๑๘,๔๐๕.๕๒	๑,๙๓๔,๔๔๙.๓๑	๖,๐๘๔,๐๕๐.๖๙	ประมาณการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ๙๖๔,๙๔๘.๐๐ บาท

หมายเหตุ แยกเป็น	งปม.ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
- ค่าท่อระบายน้ำ	๓,๐๑๗,๑๒๐.๐๐	-	๓,๐๑๗,๑๒๐.๐๐
- ค่าลูกรัง	๓๐,๓๗๐,๕๖๗.๕๐	-	๓๐,๓๗๐,๕๖๗.๕๐
- ค่าก่อสร้างหน่วยจัดที่ดินฯ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๖,๗๐๖.๕๑	๓๓,๒๙๓.๔๙
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒,๓๐๕,๐๑๒.๕๐	๑๖,๕๗๕,๖๙๕.๖๒	๒๕,๗๒๙,๓๑๖.๘๘
รวม	๗๖,๔๔๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๒๙๒,๔๐๒.๑๓	๕๙,๑๕๐,๒๙๗.๘๗

แผน/ผลการใช้จ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบลงทุน					- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ค่าก่อสร้างอื่น ๆ					
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๙,๙๓๑,๒๐๐	๙,๙๓๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๓๔,๙๖๕.๐๐	๗,๔๙๖,๒๓๕.๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเจอบ"	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๕๔๗,๗๔๗.๐๐	๒,๓๒๓,๑๕๓.๐๐	
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกมัว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเพ็ด"	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๑,๑๙๕,๗๐๐.๐๐	๓๒๙,๗๒๕.๐๐	๘๖๕,๙๗๕.๐๐	
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเผ็ด"	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๓๐๐.๐๐	๑,๗๘๒,๒๖๐.๐๐	๒,๘๖๒,๐๔๐.๐๐	
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกโจทย" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองไผ่"	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๕,๓๒๖.๐๐	๓,๕๙๐,๖๗๔.๐๐	
๖. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกทิดลา" และแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์"	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๕,๔๕๖.๐๐	๔,๑๘๖,๕๔๔.๐๐	
๗. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แปลง "โนนทรายสาธารณประโยชน์"	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๕๗๖,๖๖๐.๐๐	๙๕๒,๙๔๐.๐๐	
๘. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนหนองไม้ตาย"	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๙,๙๓๑,๑๐๐.๐๐	๒,๑๖๔,๔๔๓.๐๐	๗,๗๖๖,๖๕๗.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๒๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๑๖๖,๕๘๒.๐๐	๓๐,๐๔๔,๒๑๘.๐๐	

รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
(งบผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567)


ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	สัญญา เลขที่	วันครบ กำหนด	เงินปี 2567	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน (สทส.)	สจ 53/64	5 ก.ย.66	38,318,000	งวดที่ 14 4,830,000	33,488,000	- คณะกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 15 วันที่ 18 มี.ค. 67 - ขออนุมัติเบิกจ่าย งวดที่ 15 วันที่ 29 เม.ย. 67 - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) วันที่ 30 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจสอบเงินชดเชย ค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 50 เรื่อง


- จัดทำ Spec+TOR+ราคากลาง
- ขออนุมัติใช้ Spec+TOR+ราคากลาง
- ประกาศประกวดราคา
- ประกาศผู้ชนะ
- ลงนามในใบสั่ง/สัญญา
- เบิกจ่าย

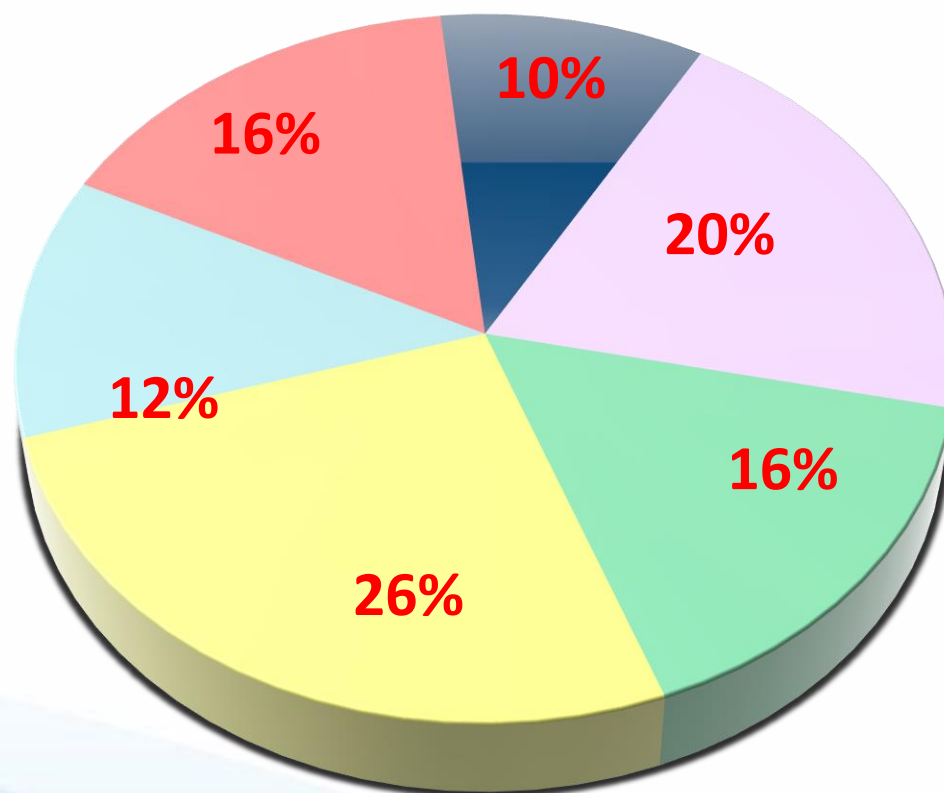

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- จัดทำ Spec + TOR + ราคากลาง จำนวน 10 เรื่อง (20%)
- ขออนุมัติใช้ Spec + TOR + ราคากลาง จำนวน 8 เรื่อง (16%)
- ประกาศประกวดราคา จำนวน 13 เรื่อง (26%)
- ประกาศผู้ชนะ จำนวน 6 เรื่อง (12%)
- ลงนามในใบสั่ง/สัญญา จำนวน 8 เรื่อง (16%)
- เบิกจ่าย จำนวน 5 เรื่อง (10%)

งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 50 เรื่อง
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน

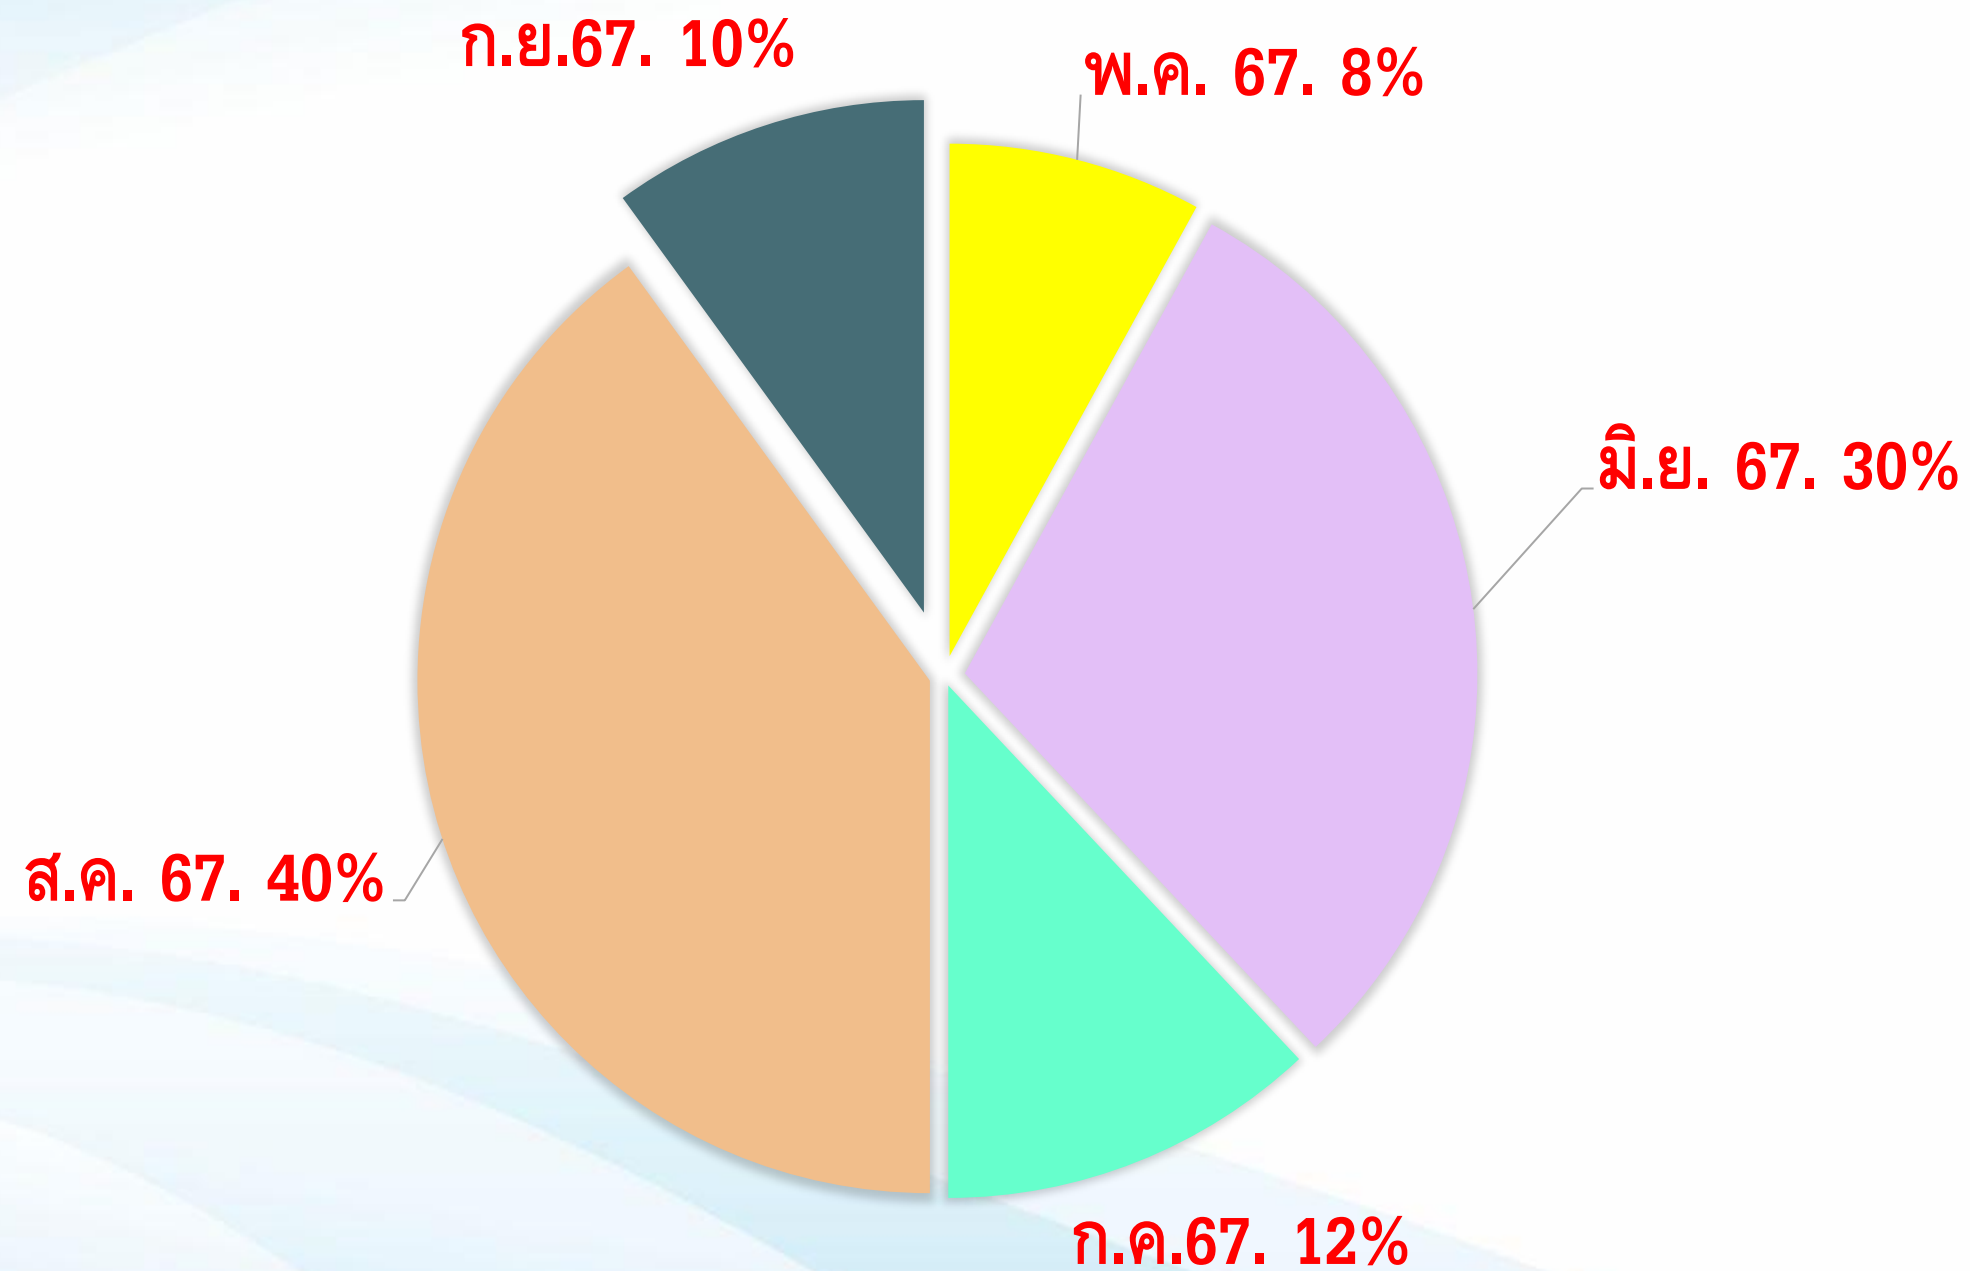

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน

- เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4 เรื่อง (8%)
- เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 15 เรื่อง (30%)
- เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 6 เรื่อง (12%)
- เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 20 เรื่อง (40%)
- เดือนกันยายน 2567 จำนวน 5 เรื่อง (10%)

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ความคืบหน้า : จัดทำรายละเอียด Spec + TOR + ราคากลาง				
ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมโยง ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่ง รูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลาง ทะเบียนทรัพย์สิน (สทส.) <i>(ICT กระทรวงมหาดไทย)</i>	20,000,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 30 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	ก.ย. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อน ผูกพัน
2	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการ ประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	83,500,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 17 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	ก.ย. 67
3	ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย)	16,994,400	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ Spec และราคากลาง วันที่ 15 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง	ก.ย. 67
4	โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุน การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน ที่ดินแบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ - ระบบพัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่าง สำนักงานแบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (สทส.) (ICT กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลฯ)	365,018,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ TOR และราคากลาง วันที่ 17 มิ.ย. 67 - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง	ก.ย. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
5	จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการ ขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบ บริหารจัดการ งานรังวัดเอกชน รวม 2 รายการ 1. พัฒนาระบบการให้บริการขออนุญาต อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน จำนวน 1 ระบบ (สทส./สชอ.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	11,000,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 26 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	ส.ค. 67
6	ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน 1 ระบบ (สทส.) <i>(ICT กระทรวงมหาดไทย)</i>	40,000,000	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง วันที่ 17 พ.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด TOR และราคากลาง	ก.ย. 67

ความคืบหน้า: เผยแพร่ร่างวิจารณ์ /ประกาศประกวดราคา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและ การบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ (สทส.) <i>(ICT กระทรวงมหาดไทย)</i>	15,000,000	- กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบโครงการ เมื่อ 4 มิ.ย. 67 - มีมติแก้ไขปรับลดวงเงินงบประมาณ จำนวน 152,000 บาท - คงเหลือเป็นเงิน 14,848,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการประกวดราคาและ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	ส.ค.67
2	ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพ ดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) จำนวน 1 ระบบ (กทผ.)	16,855,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 -21 พ.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 22 พ.ค. 67 - คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา วันที่ 29 พ.ค. 67 - รายงานผลการพิจารณา วันที่ 17 มิ.ย. 67 - ขออนุมัติจัดซื้อ วันที่ 19 มิ.ย. 67	ก.ค. 67
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 4 รายการ	9,199,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 11 - 20 มิ.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา 21 มิ.ย. 67	ก.ค. 67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะออกให้ ผูกพัน
4	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รวม 4 รายการ (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 57 คัน (2) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 5 คัน (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 10 คัน (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 9 คัน (พด.)	76,512,300	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 16 พ.ค. - 5 มิ.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา 6 มิ.ย. 67 - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ - รายการที่ 1 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย - รายการที่ 2 มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย - รายการที่ 3 มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย - รายการที่ 4 มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย - รายการที่ 4 ผู้ยื่นเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน งบประมาณ/ราคากลาง คณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ยกเลิกและแก้ไขปรับปรุง Spec และราคากลาง วันที่ 18 มิ.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 1 - 3 ยกเลิกและดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 4 ใหม่	ส.ค. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
5	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 6 แห่ง 1. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 3. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 4. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 5. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 6. ส่งมอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	46,987,179.20	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 16 - 28 พ.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 29 พ.ค. 67 - คณะกรรมการสรุปผลการประกวดราคา วันที่ 7 มิ.ย. 67 - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ	ก.ค. 67
6	ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ 4 สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน 1 ชุด (กพ.)	42,800,000	- เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 1 - 6 มิ.ย. 67 (วิจารณ์) - คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ วันที่ 11 มิ.ย. 67 - ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข Spec และราคากลาง	ส.ค. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
7	โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ กรมที่ดิน (สทส.) <i>(ICT กรมที่ดิน)</i>	39,000,000	- ประกาศเผยแพร่ร่างเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 64 - ครบวิจารณ์ 12 มิ.ย. 67 - ประกาศประกวดราคาจ้างฯ วันที่ 18 มิ.ย. 67 - เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 7 วันทำการ วันที่ 18 - 27 มิ.ย. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 28 มิ.ย. 67	ส.ค. 67

งบลงทุน 2567 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพัน
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียน ออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สทส.)	480,872,000	- ประกาศประกวดราคา วันที่ 5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 5 ก.ค. 67	ส.ค.67
2	จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของ สำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 (สทส.)	20,000,000	- เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 - ครบวิจารณ์ 4 มิ.ย. 67 (วิจารณ์ 1 ราย) - คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ร่าง TOR ตามที่มี ผู้เสนอแนะวิจารณ์ - ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ใหม่ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. 67	ส.ค.67

ลำดับ	รายการ	งบประมาณจัดจ้าง	ความคืบหน้า	คาดว่า ก่อนนี้ ผูกพัน
3	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของ สำนักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สมส.) - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 64 ชุด (รวม 5 รายการ)	27,625,600	- เผยแพร่ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๓) วันที่ 17 - 20 มิ.ย. 67 - มีผู้วิจารณ์	ส.ค.67
4	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศรท.)	15,792,000	- อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 15 พ.ค. 67 - เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 7 มิ.ย. 67 - -คณะกรรมการพิจารณาทบทวนขอบเขตของงาน (TOR) วันที่ 17 มิ.ย. 67 - มีผู้วิจารณ์เพียงรายเดียว - คณะกรรมการ TOR มีมติไม่แก้ไขร่าง TOR - ขออนุมัติประกาศประกวดราคาจ้างฯ วันที่ 19 มิ.ย. 67 - แผนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาวันที่ 21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 - ยื่นเสนอราคา วันที่ 2 ก.ค. 67	ส.ค.67

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

เรียงตามลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มิ.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 80 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 21 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1.	ระนอง	55,200.00	54,936.00	99.52	54,936.00	99.52	19.52	78.52	264.00	0.48
2.	สมุทรสงคราม	62,200.00	61,100.00	98.23	61,100.00	98.23	18.23	77.23	1,100.00	1.77
3.	ชุมพร	303,600.00	294,800.00	97.10	294,800.00	97.10	17.10	76.10	8,800.00	2.90
4.	หนองคาย	518,840.00	466,010.00	89.82	466,010.00	89.82	9.82	68.82	52,830.00	10.18
5.	พัทลุง	939,800.00	604,244.00	64.29	604,244.00	64.29	(15.71)	43.29	335,556.00	35.71
6.	สกลนคร	1,180,060.00	979,760.00	83.03	681,700.00	57.77	3.03	36.77	200,300.00	16.97
7.	ตรัง	266,400.00	201,000.00	75.45	153,000.00	57.43	(4.55)	36.43	65,400.00	24.55
8.	เพชรบุรี	604,120.00	414,320.00	68.58	286,320.00	47.39	(11.42)	26.39	189,800.00	31.42
9.	สระแก้ว	164,360.00	120,360.00	73.23	66,360.00	40.37	(6.77)	19.37	44,000.00	26.77
10.	สตูล	562,850.00	550,556.00	97.82	215,806.00	38.34	17.82	17.34	12,294.00	2.18
11.	ประจวบคีรีขันธ์	700,240.00	533,220.00	76.15	243,220.00	34.73	(3.85)	13.73	167,020.00	23.85
12.	กาญจนบุรี	1,654,120.00	639,420.00	38.66	566,420.00	34.24	(41.34)	13.24	1,014,700.00	61.34
13.	สระบุรี	451,590.00	138,590.00	30.69	138,590.00	30.69	(49.31)	9.69	313,000.00	69.31
14.	สุรินทร์	845,756.00	544,875.00	64.42	241,229.00	28.52	(15.58)	7.52	300,881.00	35.58
15.	ชัยภูมิ	703,700.00	636,800.00	90.49	189,900.00	26.99	10.49	5.99	66,900.00	9.51
16.	อุดรธานี	2,936,200.00	2,487,812.00	84.73	710,812.00	24.21	4.73	3.21	448,388.00	15.27
17.	ชัยนาท	1,308,140.00	568,838.00	43.48	313,538.00	23.97	(36.52)	2.97	739,302.00	56.52
18.	มหาสารคาม	373,520.00	89,520.00	23.97	89,520.00	23.97	(56.03)	2.97	284,000.00	76.03
19.	อุทัยธานี	1,396,070.00	1,006,770.00	72.11	334,260.00	23.94	(7.89)	2.94	389,300.00	27.89
20.	จันทบุรี	1,274,690.00	1,113,990.00	87.39	294,990.00	23.14	7.39	2.14	160,700.00	12.61
21.	บุรีรัมย์	718,520.00	707,520.00	98.47	165,520.00	23.04	18.47	2.04	11,000.00	1.53
22.	ปัตตานี	2,374,700.00	530,000.00	22.32	530,000.00	22.32	(57.68)	1.32	1,844,700.00	77.68
23.	เชียงใหม่	638,860.00	515,441.00	80.68	141,281.00	22.11	0.68	1.11	123,419.00	19.32
24.	อำนาจเจริญ	493,000.00	487,208.00	98.83	108,208.00	21.95	18.83	0.95	5,792.00	1.17
25.	แพร่	3,731,100.00	3,244,100.00	86.95	812,700.00	21.78	6.95	0.78	487,000.00	13.05
26.	สุพรรณบุรี	1,352,740.00	1,309,140.00	96.78	261,070.00	19.30	16.78	(1.70)	43,600.00	3.22
27.	พังงา	239,611.00	222,611.00	92.91	45,000.00	18.78	12.91	(2.22)	17,000.00	7.09
28.	อุบลราชธานี	1,297,410.00	730,410.00	56.30	242,000.00	18.65	(23.70)	(2.35)	567,000.00	43.70
29.	น่าน	1,915,650.00	1,437,900.00	75.06	347,800.00	18.16	(4.94)	(2.84)	477,750.00	24.94
30.	ฉะเชิงเทรา	2,853,660.00	1,540,260.00	53.97	512,860.00	17.97	(26.03)	(3.03)	1,313,400.00	46.03
31.	นราธิวาส	2,931,594.00	1,073,438.00	36.62	520,878.00	17.77	(43.38)	(3.23)	1,858,156.00	63.38
32.	พิจิตร	1,527,450.00	971,998.00	63.64	262,198.00	17.17	(16.36)	(3.83)	555,452.00	36.36
33.	สิงห์บุรี	601,880.00	456,478.00	75.84	102,478.00	17.03	(4.16)	(3.97)	145,402.00	24.16
34.	ยโสธร	2,294,277.00	2,248,777.00	98.02	376,400.00	16.41	18.02	(4.59)	45,500.00	1.98
35.	นครพนม	2,077,300.00	323,306.00	15.56	323,306.00	15.56	(64.44)	(5.44)	1,753,994.00	84.44
36.	พิษณุโลก	650,900.00	100,627.00	15.46	100,627.00	15.46	(64.54)	(5.54)	550,273.00	84.54
37.	มุกดาหาร	1,163,336.00	443,634.00	38.13	174,918.00	15.04	(41.87)	(5.96)	719,702.00	61.87
38.	ศรีสะเกษ	3,166,500.00	1,054,190.00	33.29	471,790.00	14.90	(46.71)	(6.10)	2,112,310.00	66.71
39.	นครนายก	62,650.00	8,650.00	13.81	8,650.00	13.81	(66.19)	(7.19)	54,000.00	86.19
40.	ชลบุรี	735,770.00	98,720.00	13.42	98,720.00	13.42	(66.58)	(7.58)	637,050.00	86.58
41.	บึงกาฬ	1,500,700.00	187,400.00	12.49	187,400.00	12.49	(67.51)	(8.51)	1,313,300.00	87.51
42.	ร้อยเอ็ด	5,981,340.00	735,900.00	12.30	726,900.00	12.15	(67.70)	(8.85)	5,245,440.00	87.70
43.	เพชรบูรณ์	689,400.00	220,500.00	31.98	82,500.00	11.97	(48.02)	(9.03)	468,900.00	68.02

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มิ.ย. 67		งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	ทำสัญญา ร้อยละ 80 (ต่ำกว่า)	เบิกจ่าย ร้อยละ 21 (ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
44.	เชียงราย	4,978,800.00	1,490,360.00	29.93	552,460.00	11.10	(50.07)	(9.90)	3,488,440.00	70.07
45.	นครศรีธรรมราช	1,776,700.00	190,000.00	10.69	190,000.00	10.69	(69.31)	(10.31)	1,586,700.00	89.31
46.	อุดรดิตถ์	3,856,850.00	777,990.00	20.17	378,390.00	9.81	(59.83)	(11.19)	3,078,860.00	79.83
47.	ระยอง	1,600,600.00	152,430.00	9.52	152,430.00	9.52	(70.48)	(11.48)	1,448,170.00	90.48
48.	สงขลา	2,764,803.00	580,703.00	21.00	196,500.00	7.11	(59.00)	(13.89)	2,184,100.00	79.00
49.	ปทุมธานี	3,201,372.02	2,339,760.00	73.09	206,154.00	6.44	(6.91)	(14.56)	861,612.02	26.91
50.	ตราด	1,028,190.00	1,022,090.00	99.41	61,440.00	5.98	19.41	(15.02)	6,100.00	0.59
51.	นครราชสีมา	6,907,110.00	5,648,494.00	81.78	411,854.00	5.96	1.78	(15.04)	1,258,616.00	18.22
52.	สมุทรสาคร	1,518,550.00	1,516,150.00	99.84	90,000.00	5.93	19.84	(15.07)	2,400.00	0.16
53.	ตาก	238,410.00	11,852.00	4.97	11,852.00	4.97	(75.03)	(16.03)	226,558.00	95.03
54.	นนทบุรี	234,990.00	11,490.00	4.89	11,490.00	4.89	(75.11)	(16.11)	223,500.00	95.11
55.	อ่างทอง	604,590.00	363,315.00	60.09	28,315.00	4.68	(19.91)	(16.32)	241,275.00	39.91
56.	ขอนแก่น	2,322,400.00	98,000.00	4.22	98,000.00	4.22	(75.78)	(16.78)	2,224,400.00	95.78
57.	หนองบัวลำภู	143,844.00	5,600.00	3.89	5,600.00	3.89	(76.11)	(17.11)	138,244.00	96.11
58.	แม่ฮ่องสอน	1,965,531.00	198,260.00	10.09	72,000.00	3.66	(69.91)	(17.34)	1,767,271.00	89.91
59.	ลำปาง	5,442,857.48	2,836,742.00	52.12	188,000.00	3.45	(27.88)	(17.55)	2,606,115.48	47.88
60.	สุราษฎร์ธานี	6,126,870.00	999,170.00	16.31	211,000.00	3.44	(63.69)	(17.56)	5,127,700.00	83.69
61.	ลำพูน	1,410,388.00	46,600.00	3.30	46,600.00	3.30	(76.70)	(17.70)	1,363,788.00	96.70
62.	ลพบุรี	302,820.00	9,720.00	3.21	9,720.00	3.21	(76.79)	(17.79)	293,100.00	96.79
63.	ยะลา	3,836,100.00	2,748,600.00	71.65	91,000.00	2.37	(8.35)	(18.63)	1,087,500.00	28.35
64.	เลย	617,720.00	13,752.00	2.23	13,752.00	2.23	(77.77)	(18.77)	603,968.00	97.77
65.	ปราจีนบุรี	71,580.00	1,380.00	1.93	1,380.00	1.93	(78.07)	(19.07)	70,200.00	98.07
66.	กาฬสินธุ์	444,500.00	401,420.00	90.31	7,320.00	1.65	10.31	(19.35)	43,080.00	9.69
67.	พะเยา	1,273,310.00	679,610.00	53.37	18,210.00	1.43	(26.63)	(19.57)	593,700.00	46.63
68.	กำแพงเพชร	843,140.00	284,840.00	33.78	8,340.00	0.99	(46.22)	(20.01)	558,300.00	66.22
69.	ราชบุรี	723,320.00	6,600.00	0.91	6,600.00	0.91	(79.09)	(20.09)	716,720.00	99.09
70.	นครสวรรค์	1,181,350.00	129,870.00	10.99	9,570.00	0.81	(69.01)	(20.19)	1,051,480.00	89.01
71.	สุโขทัย	1,363,840.00	366,124.00	26.85	9,924.00	0.73	(53.15)	(20.27)	997,716.00	73.15
72.	ภูเก็ต	417,780.00	3,000.00	0.72	3,000.00	0.72	(79.28)	(20.28)	414,780.00	99.28
73.	นครปฐม	1,430,800.00	7,480.00	0.52	7,480.00	0.52	(79.48)	(20.48)	1,423,320.00	99.48
74.	กระบี่	1,348,100.00	366,022.00	27.15	2,022.00	0.15	(52.85)	(20.85)	982,078.00	72.85
75.	สมุทรปราการ	2,826,698.00	2,805,498.00	99.25	-	-	19.25	(21.00)	21,200.00	0.75
76.	พระนครศรีอยุธยา	161,946.00	3,450.00	2.13	-	-	(77.87)	(21.00)	158,496.00	97.87
รวมทั้งสิ้น		118,265,663.50	56,271,501.00	47.58	15,710,362.00	13.28	(32.42)	(7.72)	61,994,162.50	52.42

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 25 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 19 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 32 จังหวัด

4. จัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน ดังนี้

4.1 บลจทุน 108,449,333.50 บาท (โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 - 3 แล้ว) ครุภัณฑ์ เงิน 76,109,248.48 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,340,085.02 บาท

4.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,970,330 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" เงิน 3,942,000 บาท

ค่าพาหนะฯ (หลักสูตรต้นกล้าฯ 1 - 2) เงิน 685,500 บาท ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) เงิน 4,206,830 บาท

โครงการมอบโฉนด เงิน 4,000 บาท โครงการรังวัดสอบเขตฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 132,000 บาท

4.3 งบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 846,000 บาท เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขต ที่ดิน ขนาด 36 ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ฯลฯ	7,495,000	- ราคากลาง 7,495,856.29 บาท - อยู่ระหว่างพิจารณาการอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอมติอุทธรณ์ ผลการพิจารณาฯ - วงเงินก่อสร้าง 6,045,000 บาท
2. สจ. พังงา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพัก อาศัย คสล.3 ชั้น ๙ หน่วย พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	7,670,000	- ราคากลาง 7,695,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. สจ. สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	ขยายเขื่อนน้ำประปา	8,076,100	- อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4. สจ. ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์	ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,120,000	- ราคากลาง 11,257,600 บาท - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการประกวดราคาครบกำหนด วันที่ 26 มิถุนายน 2567 - วงเงินก่อสร้าง 11,068,000 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
5. สจ. สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	15,495,600	- อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6. สจ. สระบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,361,400	- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. สจ. อุทัยธานี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	18,779,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
8. สจ. กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	19,194,100	- ราคากลาง 19,205,910 บาท - อยู่ระหว่างเสนอขอจ้างและร่างประกาศประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ 207 รายการ 99,466,503 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

การเชิญชวน/สืบราคา

อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

7

-

80

76

11,155,898

วิธีเฉพาะเจาะจง 163 รายการ
(วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ราคากลาง/TOR

ประกาศประกวดราคา

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ลงนามในสัญญา

วงเงินตามสัญญา

23

9

9

3

2,304,777

วิธี E – Bidding) 44 รายการ
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
1.	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน*	31 ชุด	5,580,000		จัดซื้อส่วนกลาง
2.	ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลั่นชัก*	170 ตู้	1,819,000		จัดซื้อส่วนกลาง
3.	ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน*	45 ตู้	900,000		จัดซื้อส่วนกลาง
4.	ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว*	50 ตู้	900,000		จัดซื้อส่วนกลาง
5.	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน (นอกเหนือมาตรฐานกรมที่ดิน)**	1 ชุด / 1 จังหวัด	112,400		จัดซื้อส่วนกลาง
6.	ตู้โทรศัพท์สาขา	18 ชุด / 16 จังหวัด	916,200	552,680	78,150
7.	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 1.50 เมตร และขนาด 2 เมตร	683 ชุด / 63 จังหวัด	114,639,000	11,248,662	489,000
8.	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	1,582 ตู้ / 58 จังหวัด	9,492,000	5,704,610	2,678,250
9.	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	680 ชุด / 38 จังหวัด	4,624,000	3,158,220	850,480
10.	เก้าอี้บริการประชาชน (แบบเดี่ยว)	150 ตัว / 13 จังหวัด	675,000	464,010	233,300
11.	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น	114 เครื่อง / 49จังหวัด	5,684,800	3,707,500	1,502,140

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
12.	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนหรือตั้งพื้นฯ 13000 บีทียู, 18000 บีทียู, 24000 บีทียู, 32000 บีทียู และ 36000 บีทียู	1,435 เครื่อง / 62 จังหวัด	58,673,300	12,241,680	1,970,754
13.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	17 เครื่อง / 11 จังหวัด	2,040,000	1,189,200	829,200

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนกลาง 15 รายการ เงิน 38.17 ล้านบาท

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-มิ.ย.67)	มิ.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนกลาง											
งบดำเนินงาน											
1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10.04.67	4,940,000.00		4,940,000.00		0.00	0.00	0.00	4,940,000.00
								-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น											
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	23.07.2567	4,660,000.00		4,660,000.00		2,330,000.00	3,728,000.00 80.00%	1,398,000.00 30.00%	932,000.00
3	สำนักมาตรฐานและ ส่งเสริมการรังวัด	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	22.06.67	29,688,888.00		26,719,999.20		11,875,555.20	11,875,555.20 44.44%	0.00 0.00%	14,844,444.00
4	ศูนย์ข้อมูลแผนรูปแบบที่ดิน	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	03.04.67	18,900,000.00		17,010,000.00		1,890,000.00	1,890,000.00	0.00 0.00%	15,120,000.00
								-	-		
งบลงทุน											
5	ศูนย์ข้อมูลแผนรูปแบบที่ดิน	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ 3 มิติ (รวม 11 รายการ)	26.06.67	3,767,600.00		3,767,600.00	1,429,864.00	0.00	0.00	0.00	2,337,736.00
								-	-	-	


รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566

จำนวน 6 เรื่อง

■ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

■ อยู่ระหว่างส่งมอบของ

■ เบิกจ่ายแล้ว

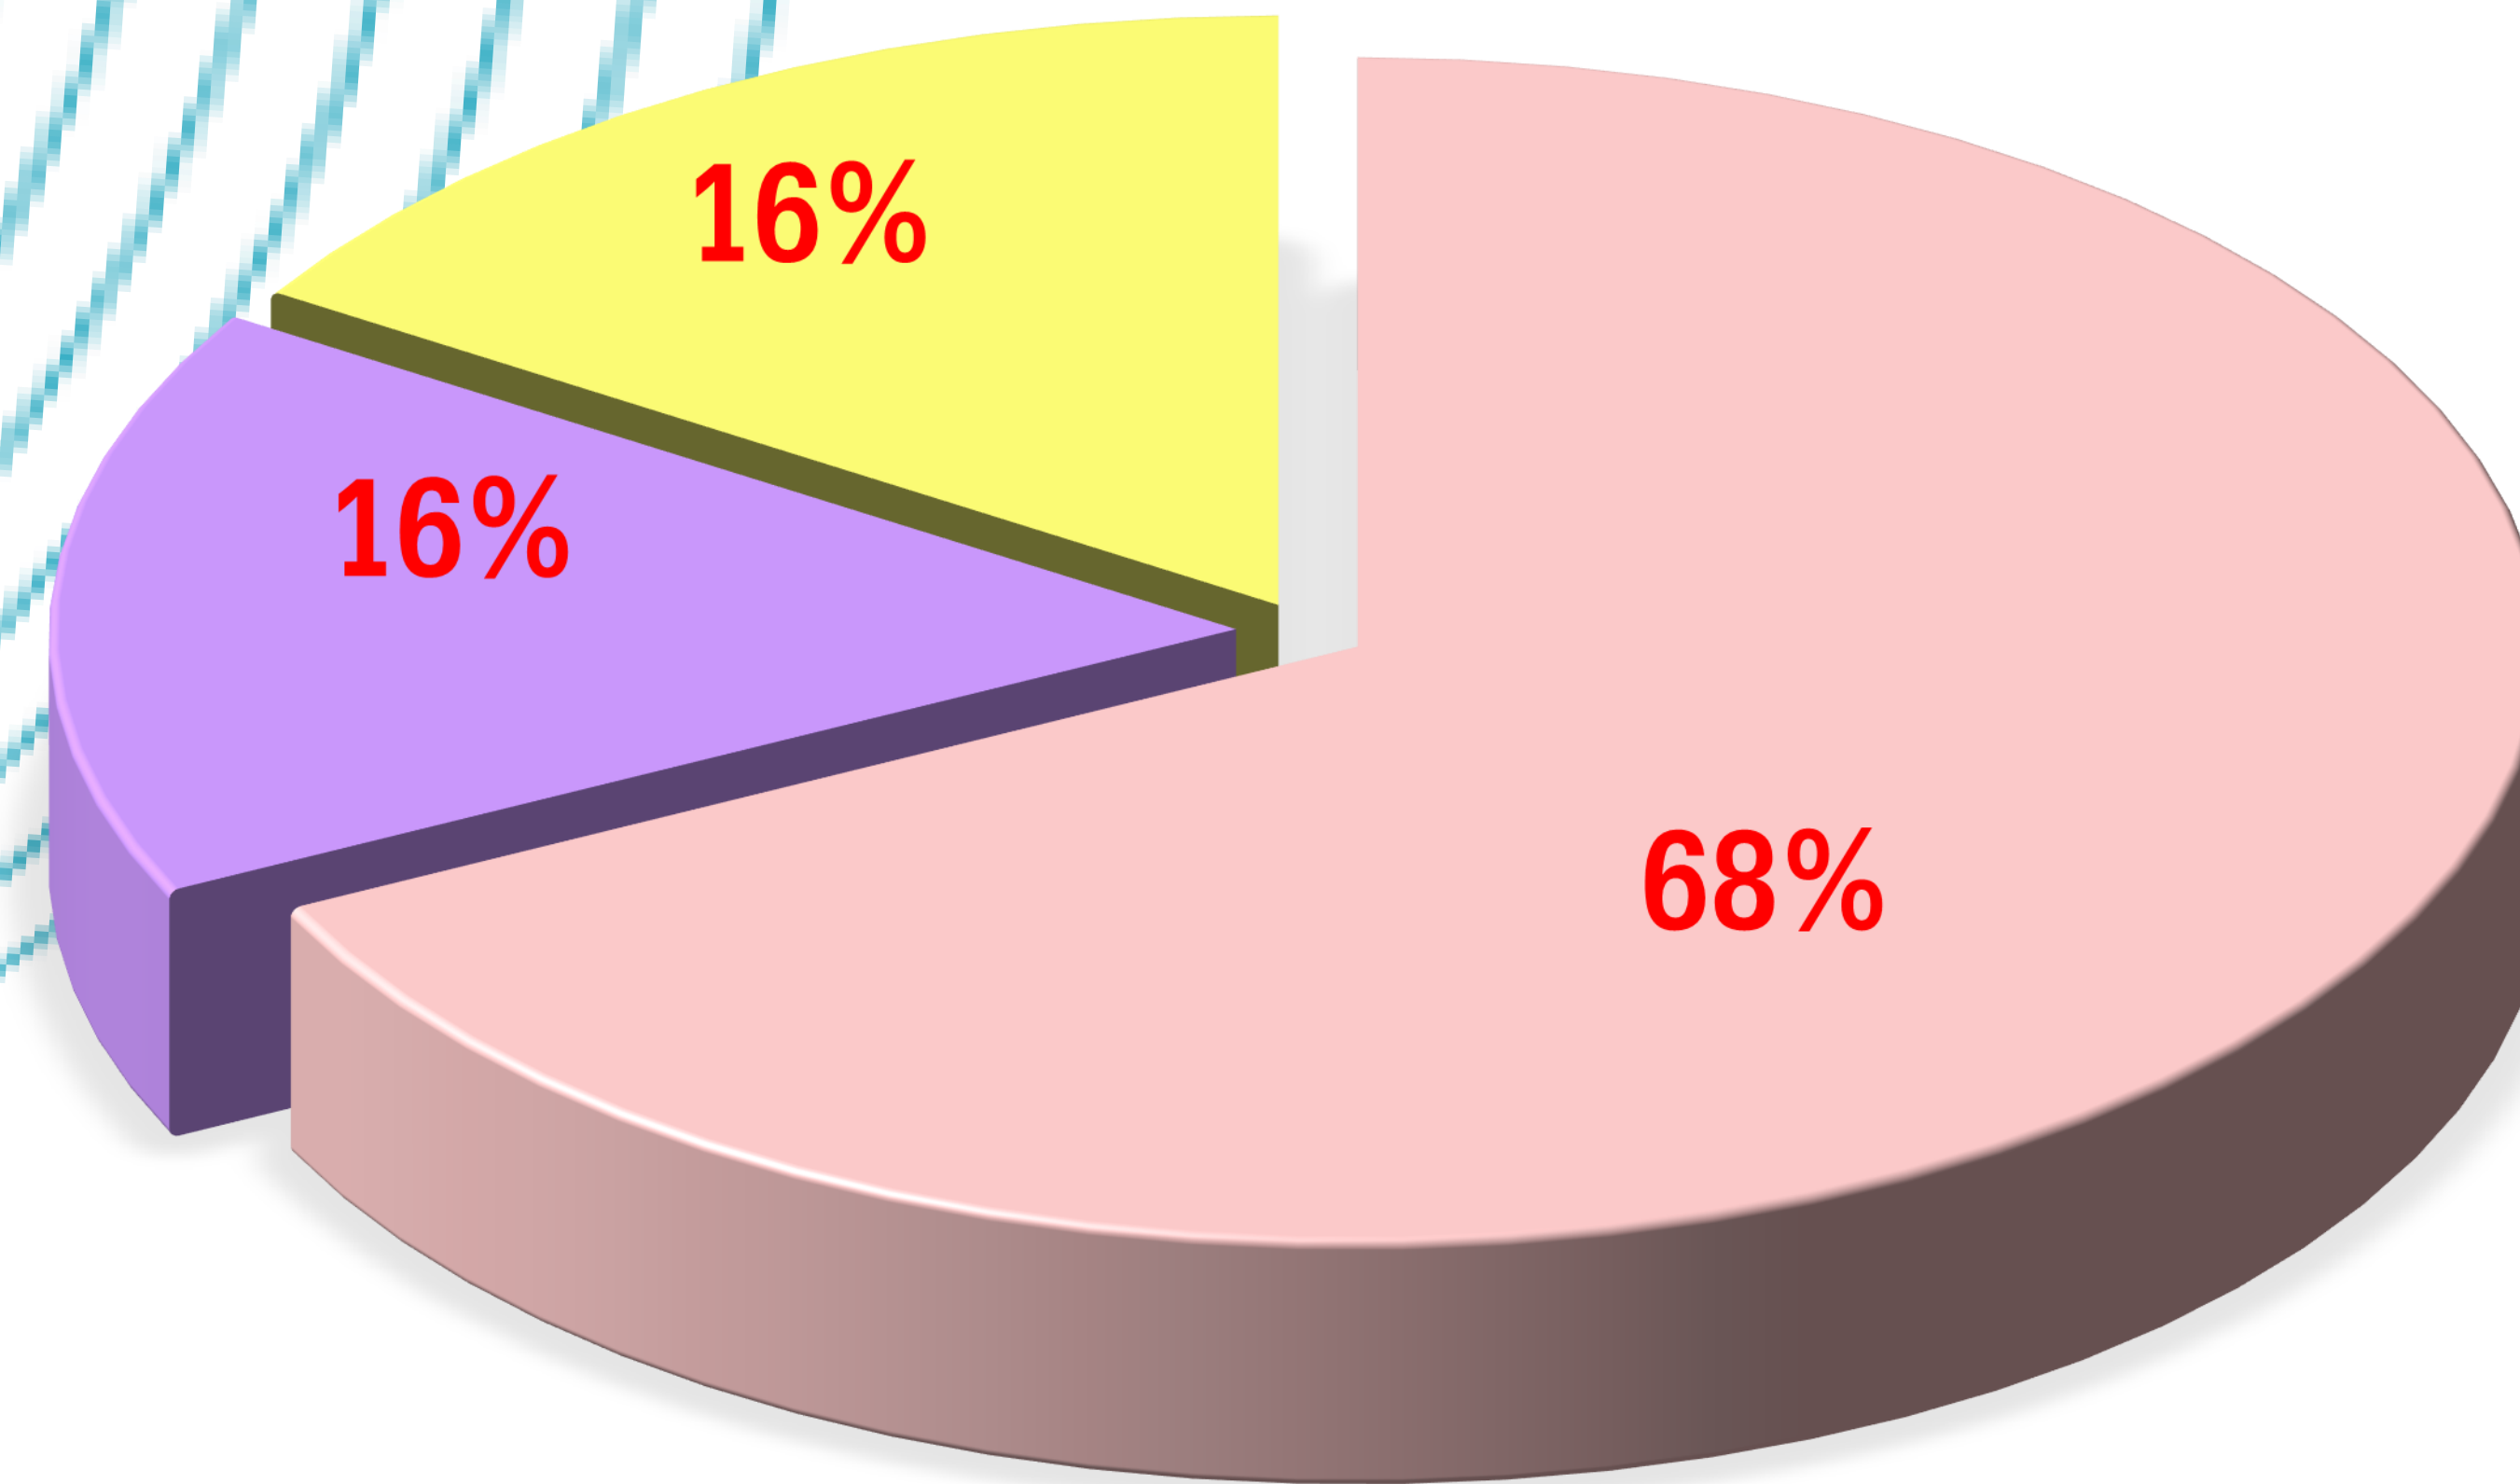

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 4 เรื่อง (67%)
- อยู่ระหว่างส่งมอบของ จำนวน 1 เรื่อง (16%)
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 เรื่อง (17%)

งบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา						
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,940,000	10 เม.ย.67 (300 วัน) งวดที่ 1 = ครั้งที่ 1 -4 งวดที่ 2 = ครั้งที่ 5	-	2 งวด 4,940,000	- บริษัทฯ ส่งมอบงานครั้งที่ 4 (งวดที่ 1) วันที่ 14 ก.พ. 67 - บริษัทฯ ที่ 2 ส่งมอบงานครั้งที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 เม.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานฯ - แจ้งแก้ไขงานฯ ครั้งที่ 5
2	จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญา ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	4,660,000	24 ก.ค.67 (300 วัน) 4 งวด	งวดที่ 1 932,000 งวดที่ 2 1,398,000 งวดที่ 3 1,398,000	งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 932,000	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4

งบลงทุน (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา						
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29,688,888	22 มิ.ย.67 (360 วัน) 2 งวด	เงินล่วงหน้า 2,968,888.80 งวดที่ 1 11,875,555.20	1 งวด งวดที่ 2 14,844,444	- บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 7 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
2	จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต	18,900,000	3 เม.ย.67 (300 วัน) 4 งวด	เงินล่วงหน้า 1,890,000 และงวดที่ 1 1,890,000	3 งวด 15,120,000	คณะกรรมการพิจารณาผลการส่งมอบงานครั้งที่ 5 วันที่ 24 พ.ค. 67 เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขการส่งมอบงาน ครั้งที่ 5

งบรายจ่ายอื่น (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างส่งมอบของ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดจ้าง	วันครบ กำหนด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความคืบหน้า
1	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุด แบบ 3 มิติ	3,767,600	26 มิ.ย.67	-	2,337,736	- ครบกำหนดส่งมอบของ วันที่ 26 มิ.ย. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบของ วันที่ 17 มิ.ย. 67 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ

งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง)

ความคืบหน้า : เบิกจ่ายแล้ว

1	จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน 100,000 แฟ้ม	8,500,000	29 ม.ค.67 (90 วัน) 2 งวด	งวดที่ 1 4,250,000 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 4,250,000	-	ส่งกองคลังเบิกจ่ายงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) วันที่ 24 พ.ค. 67 ค่าปรับ 55,029 บาท คงเหลือ 4,194,971 บาท
---	--	-----------	--------------------------------	--	---	--

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 9 รายการ เงิน 167.75 ล้านบาท

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-มิ.ย.67)	มิ.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
1	พังงา สย.เกาะยาว	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	31.10.2567	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00			2,444,000.00	2,444,000.00	16,356,000.00
								-	-	13.00%	
2	ขอนแก่น สข.ชุมแพ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาด กลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สาขาชุมแพ	21.09.2567	25,650,000.00	0.00	25,650,000.00	801,000.00	4,739,850.00	4,739,850.00	0.00	20,109,150.00
								18.48%	18.48%	0.00%	
3	กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 ยูนิต พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	08.09.2567	24,949,500.00	0.00	24,949,500.00	28,882.52	7,235,355.00	7,235,355.00	0.00	17,685,262.48
								-	29.00%	0.00%	
4	สมุทรสงคราม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คสล 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23.09.2567	40,099,555.00	4,009,955.50	36,089,599.50		9,383,295.84	11,187,775.81	1,804,479.97	24,901,823.69
								26.00%	31.00%	5.00%	
5	ราชบุรี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21.05.2567	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00		7,260,000.00	7,260,000.00	0.00	9,240,000.00
								44.00%	44.00%	0.00%	

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 9 รายการ เงิน 167.75 ล้านบาท

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกปั๊บ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-มิ.ย.67)	มิ.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)											
6	ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.๓ ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.09.2567	41,873,000.00	0.00	41,873,000.00	2,289,598.00	11,109,762.00	18,228,172.00	7,118,410.00	21,355,230.00
								-	43.53%	17.00%	
7	อุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	20.08.2567	54,250,000.00	0.00	54,250,000.00	2,859,900.00	15,271,104.00	15,271,104.00	0.00	36,118,996.00
								-	28.15%	0.00%	
8	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน	21.06.2567	39,400,000.00	0.00	39,400,000.00	589,911.71	14,319,048.29	19,728,668.29	5,409,620.00	19,081,420.00
	สข.กันทรลักษ์	และบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น						-	50.07%	13.73%	
9	ปัตตานี	ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17.04.2567	13,837,600.00	2,214,016.00	11,623,584.00		6,503,672.00	8,717,688.00	2,214,016.00	2,905,896.00
								55.95%	75.00%	19.05%	

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. สจ. พังงา ส่วนแยกเกาะยาว
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน อาคาร คสล. พร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น 18,800,000
บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
18,800,000	7 ก.ย. 66	31 ต.ค. 67	19	2,440,000	2,444,000	16,356,000	12.97	28.18
- เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด คงเหลือ 17 งวด - งวดที่ 3 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 - ผู้รับจ้างได้เร่งทำงานทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567								



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. สจ. ขอนแก่น สข.ชุมแพ ก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คลส. ขนาดกลางพร้อม
ส่วนประกอบที่จำเป็น 29,060,000
บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม –พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,849,000	28 ส.ค. 66	21 ก.ย. 67	10	4,739,850	4,739,850	20,109,150	19.07	50

- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 7 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1 วงเงินตามสัญญาเดิม 25,650,000 บาท เป็น 24,849,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 และดำเนินงานงวดที่ 5 , 6, และ 10 ควบคู่กันไป
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567

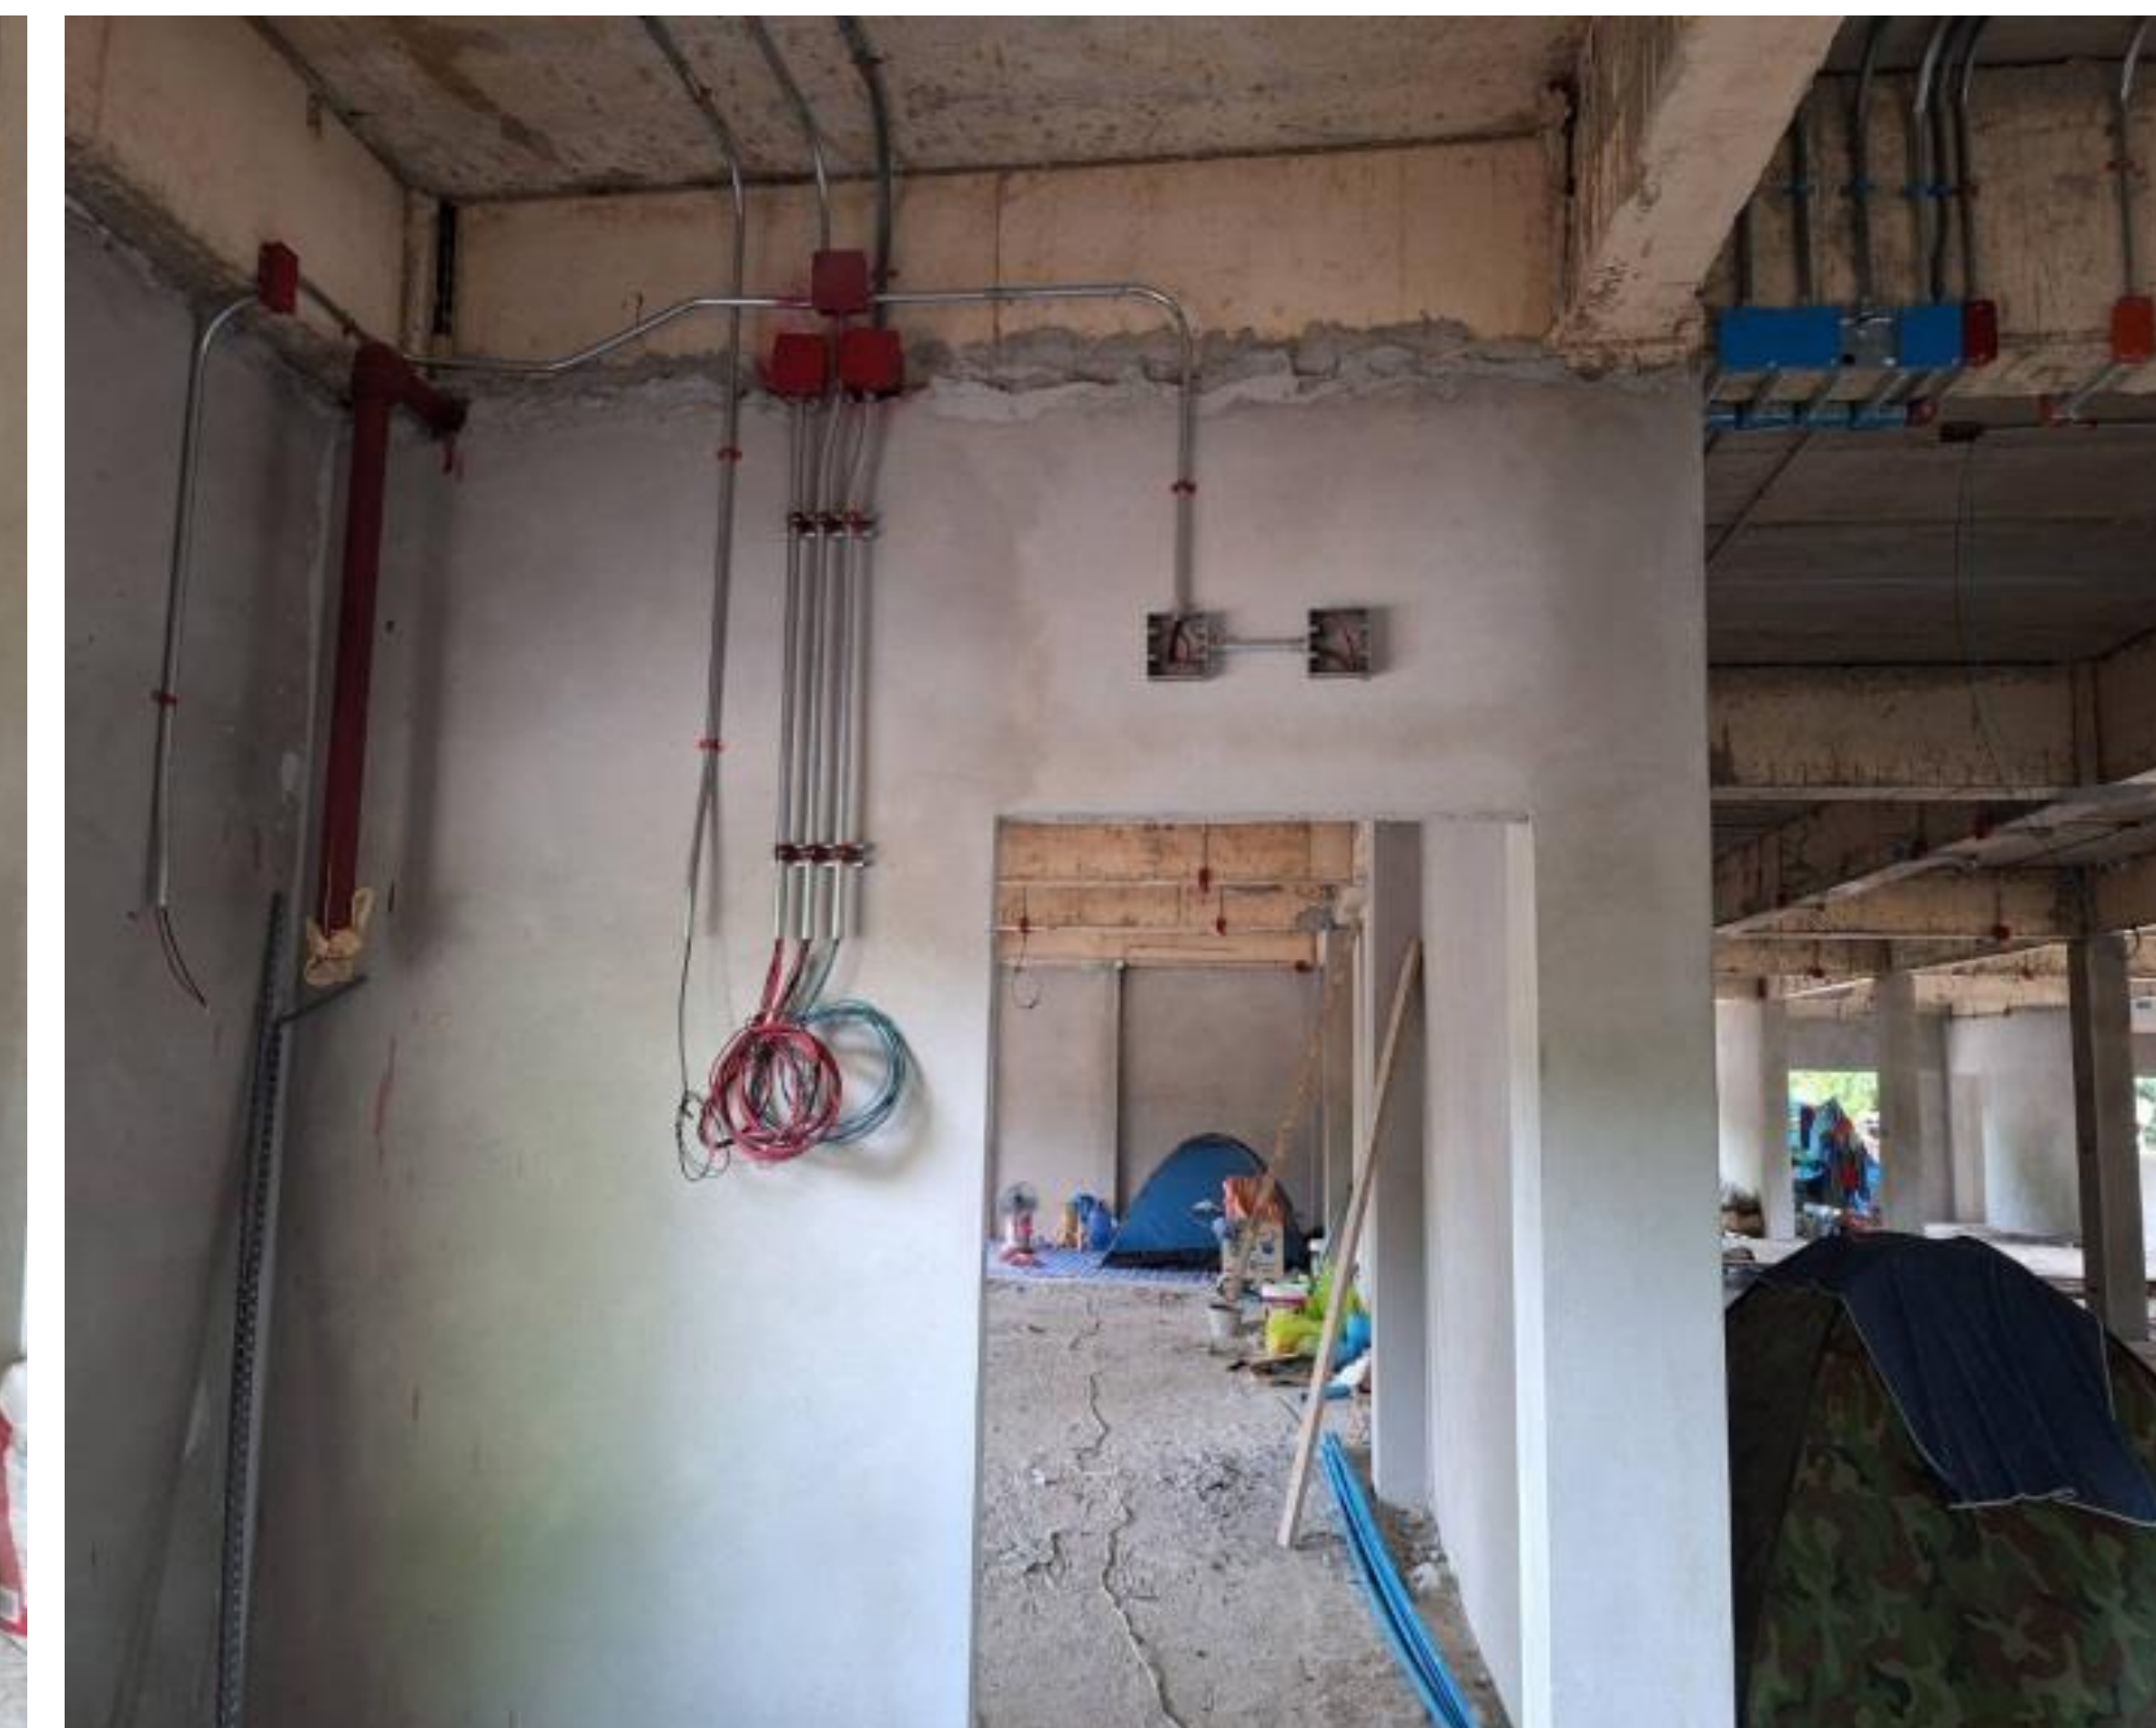

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. สจ. กาญจนบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 28 หน่วย
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
27,032,900 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
24,920,617.48	14 ก.ค. 66	8 ก.ย. 67	16	7,235,355	7,235,355	17,685,262.48	29.03	52.72

- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 8 งวด
- ได้แก้ไขสัญญาขยายวันเพิ่ม 20 วัน จากเดิม 19 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 8 กันยายน 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 9, 10 และ 11
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. สจ. สมุทรสงคราม ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 50,054,000 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
40,099,555	1 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 67	16	13,393,251.34	15,197,731.31	24,901,823.69	37.89	49.50

- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 9 งวด
- เบิกจ่ายล่วงหน้า 10 % จำนวน 4,009,955.50 บาท
- งานที่ 9 คณะกรรมการตรวจรับฯ นัดตรวจรับในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 10 และ 11
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
16,500,000	28 มี.ค. 66	21 พ.ค. 67	17	7,260,000	7,260,000	9,240,000	44	72.00

5. สจ. ราชบุรี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 6 ยูนิต
จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 17,100,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด คงเหลือ 9 งวด
- งวดที่ 5, 13 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1,815,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 6 งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งและเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมเดินสายไฟฟ้าร้อยในท่อ และงวดที่ 14 ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าและวัสดุแผ่นฝ้าเพดานภายนอกอาคาร อาคารหลังที่ 1 แลอาคารหลังที่ 2
- ผู้รับจ้างได้ให้คำมั่นว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม 2567 และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6. สจ. ชัยภูมิ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 48,224,000 บาท

วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม	ครบกำหนดส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	ผลเบิกจ่ายสะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่ายสะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลงาน
39,583,402	26 ก.ย. 66	20 ก.ย. 67	28	11,109,762	18,228,172	21,355,230	46.05	62

- เบิกจ่ายแล้ว 15 งวด คงเหลือ 13 งวด
- แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 วงเงินตามสัญญาเดิม 41,873,000 บาท มีการปรับลดค่างานเพิ่ม 2,289,598 บาท คงเหลือ 39,583,402 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 4, 7, 11, 12 และ 23
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567

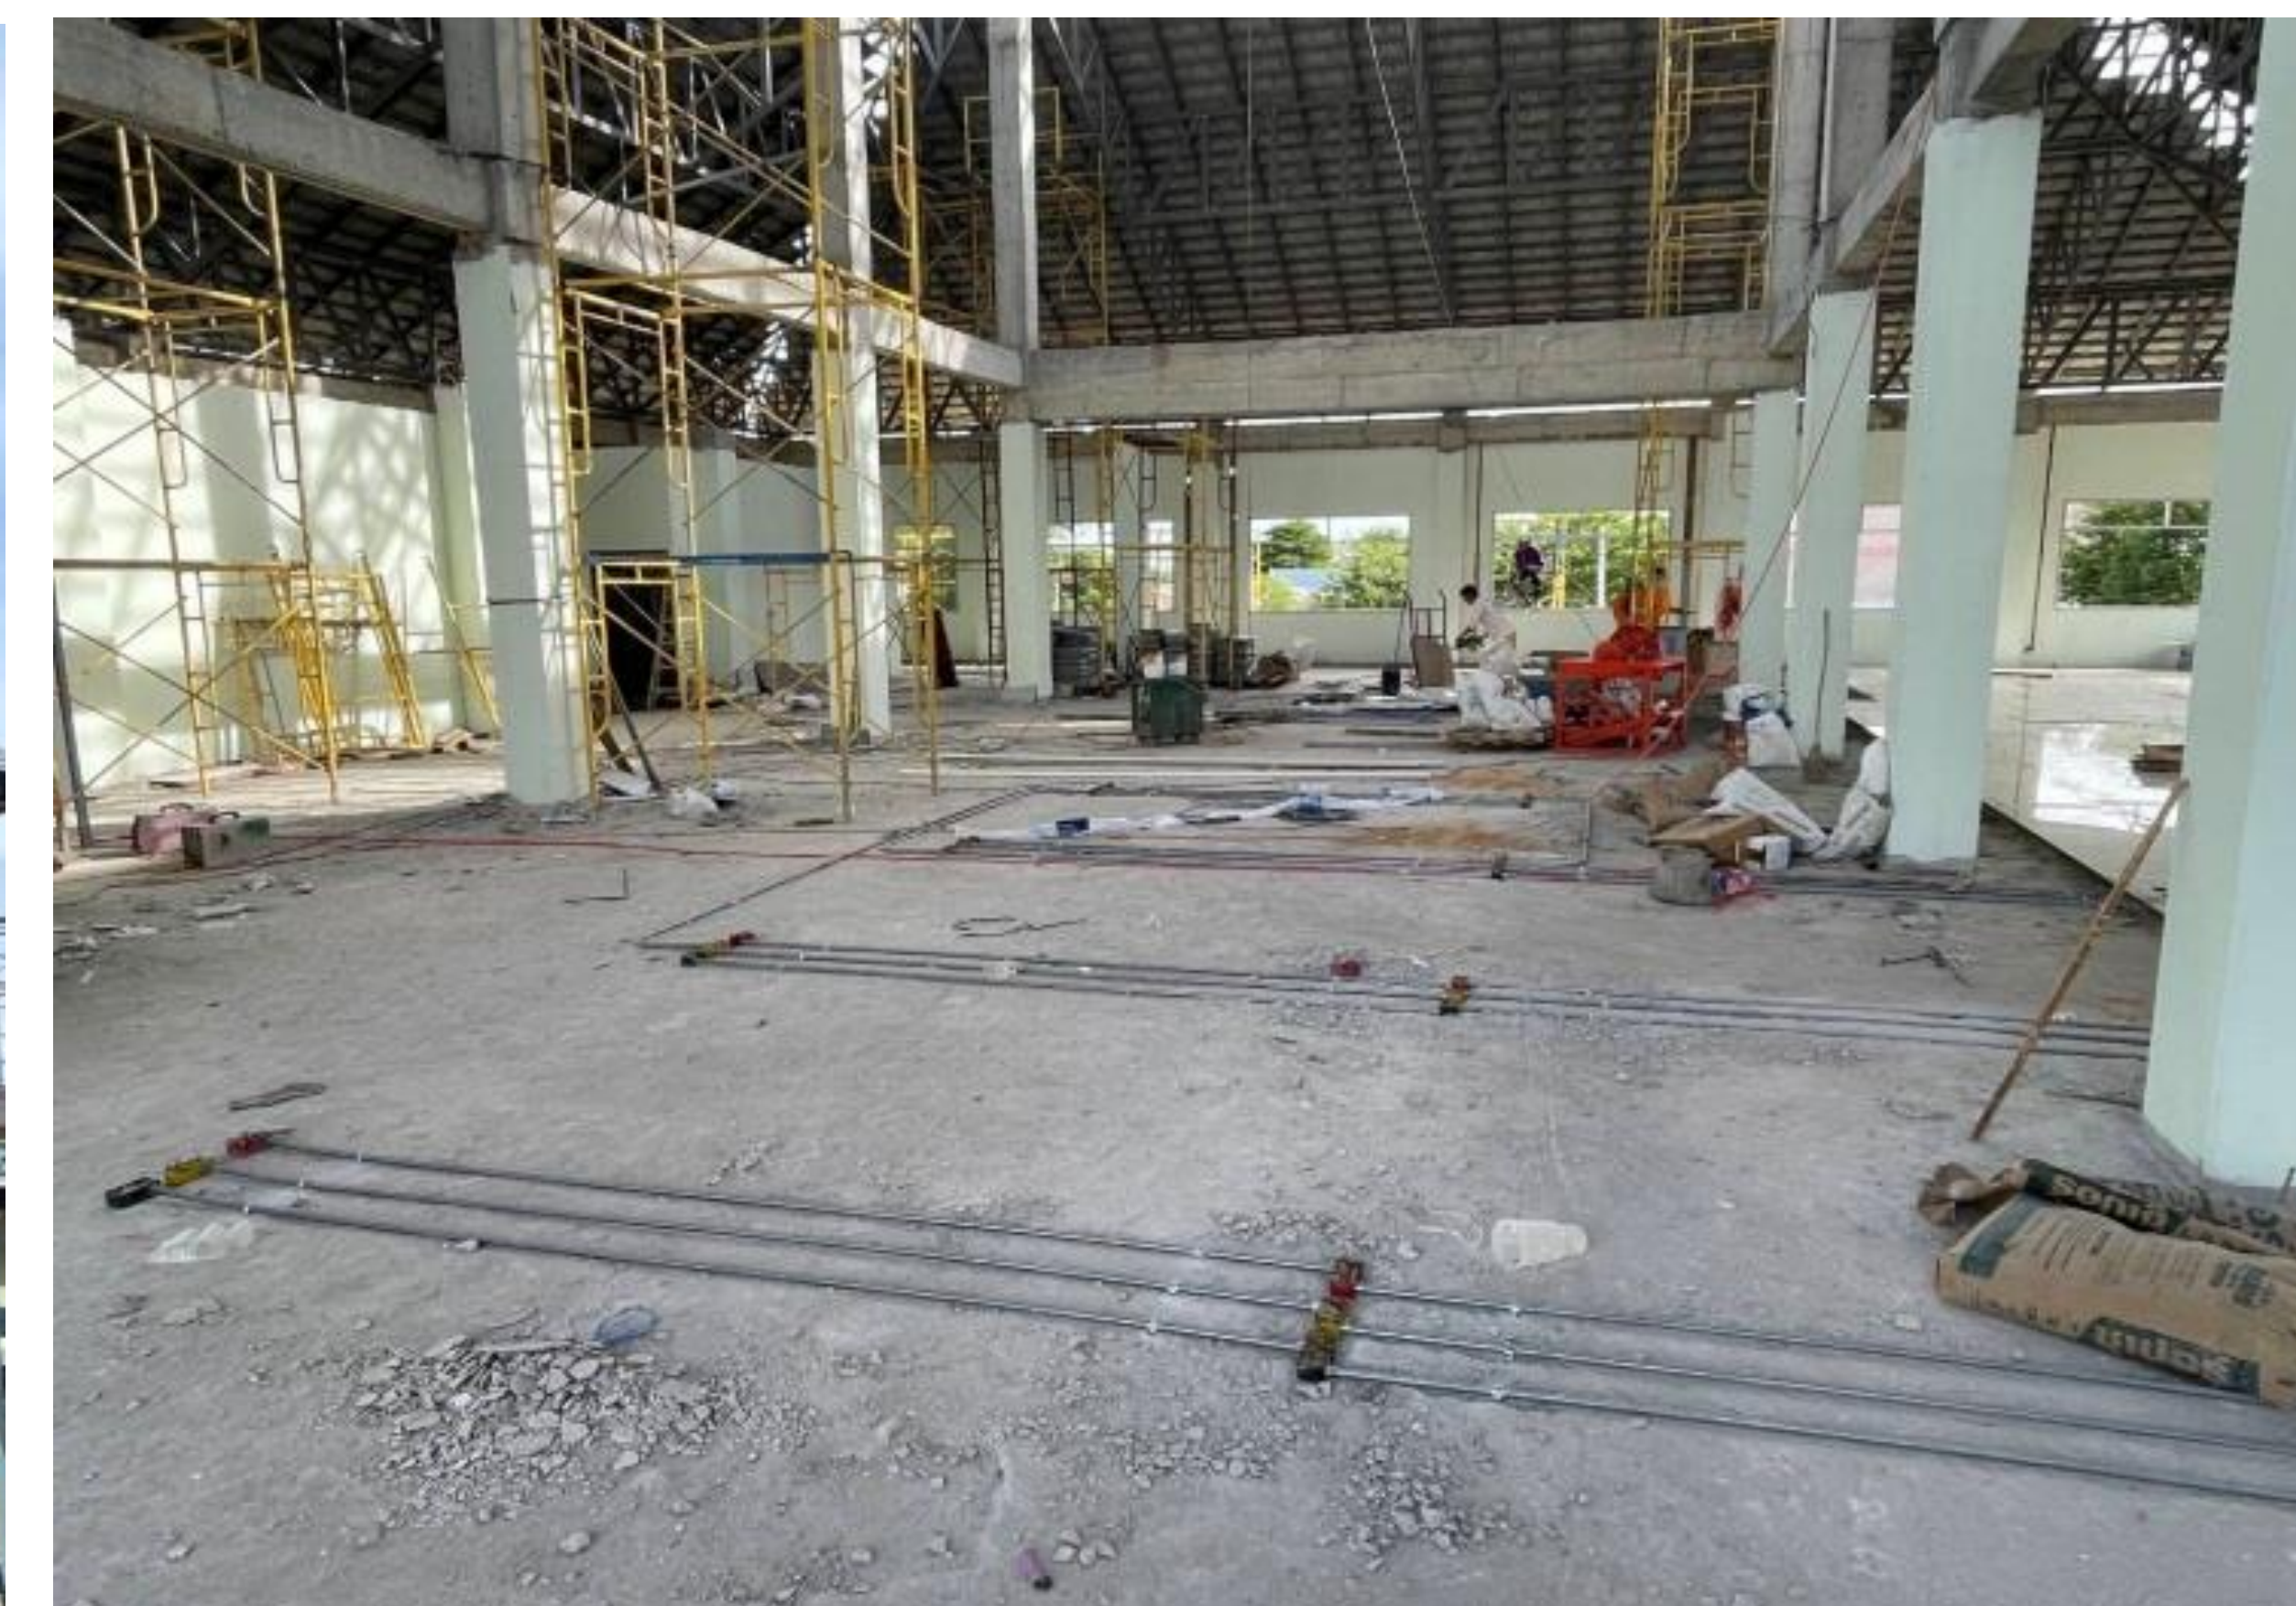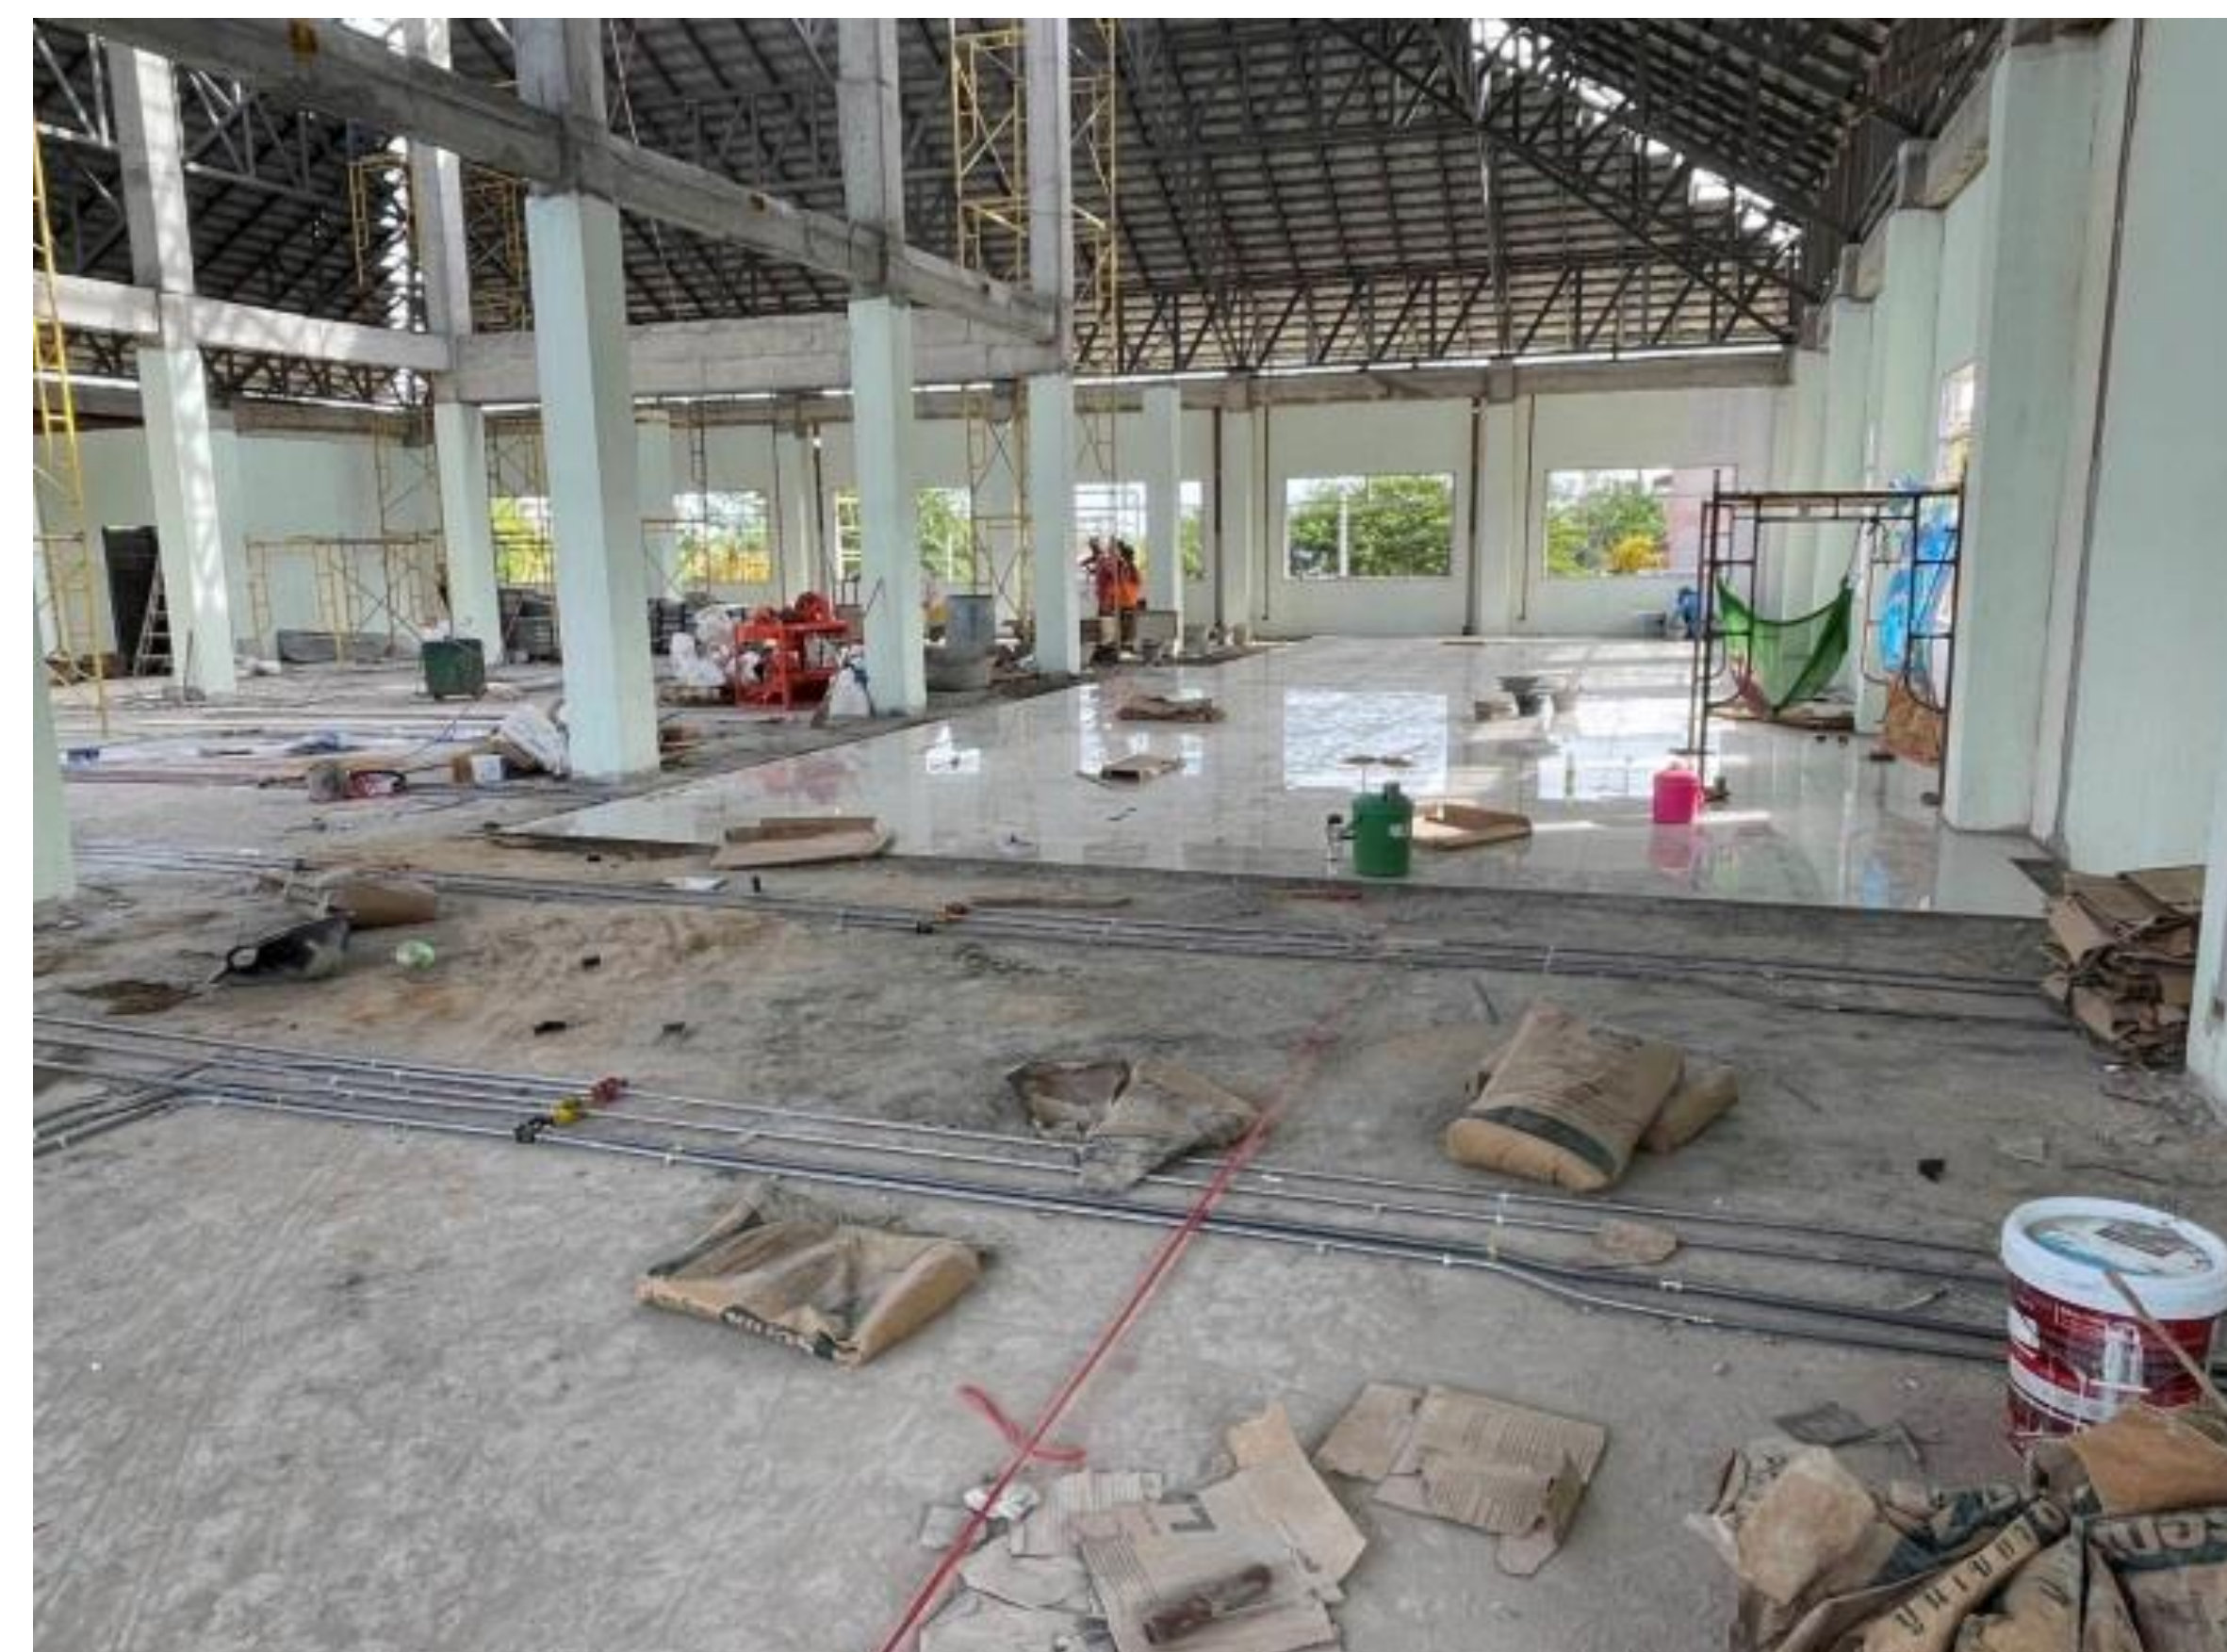

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. สจ. อุบลราชธานี ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร
คสล.ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น 54,734,000 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
51,390,100	27 ก.พ. 66	20 ส.ค. 67	18	15,271,104	15,271,104	36,118,996	29.71	76.53

- เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 7 งวด
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 14, 15, 16, 17, 18 (งวดสุดท้าย)
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 12 และ 13
- แก้ไขสัญญาจ้าง โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างเดิม 54,250,000 บาท เป็น 51,390,100 บาท และปรับงวดงานงวดเงิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนสิงหาคม 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. สจ. ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดิน และบ้านพักข้าราชการ
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
43,179,800 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
38,810,088.29	28 เม.ย. 66	21 มิ.ย. 67	14	14,319,048.29	19,728,668.29	19,081,420	50.83	85.50

- เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 7 งวด
- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 8 - 10
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 11 - 14
- ** ปัญหา/อุปสรรค ผู้รับจ้างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า
แนวทางแก้ไข แจ้งให้ผู้รับจ้างหาช่างและคนงานเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9. สจ. ปัตตานี ก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น 11 ยูนิต
พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
13,837,600 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค.	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย.	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
13,837,600	14 มี.ค. 66	17 ก.ค. 67	12	9,963,072	10,931,704	2,905,896	79	87

- เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด เหลือ 2 งวด
- ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 90 วัน ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 จากสัญญาจ้าง 17 เมษายน 2567 เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้าง 19 กรกฎาคม 2567
- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 11 งานก่อสร้างรั้วและงานระบบระบายน้ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมปักเสาพาดสายเข้าอาคาร และงานงวดที่ 12 ติดตั้งถังเก็บน้ำ ติดตั้งระบบประปา มิเตอร์ ครุภัณฑ์ ทาสีอาคารทั้งหมดเชื่อมระบบไฟฟ้าและประปาให้กับอาคารให้สามารถใช้งานได้ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2567



เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

ส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 2 รายการ เงิน 4.67 ล้านบาท

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	สำนักกอง/จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2566	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	ตกพับ	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-พ.ค.67)	เบิกจ่ายสะสม (ต.ค.66-มิ.ย.67)	มิ.ย.67 เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค											
งบลงทุน (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)											
1	อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน	15.09.2567	3,886,550.00	0.00	3,886,550.00	597,550.00	305,030.00	305,030.00	0.00	2,983,970.00
	สาขากุมภวาปี	สาขากุมภวาปี						7.85%	7.85%	7.85%	
2	อุทัยธานี	ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร	09.10.2566	2,198,000.00	329,700.00	1,868,300.00	2,460.00	175,840.00	175,840.00	0.00	1,690,000.00
		รั้ว ประตู ทางเข้า-ออก						9.41%	9.41%		

สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10. สจ. อุดรธานี สาขากุมภวาปี
ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและ
ห้องสารบบที่ดิน
4,244,400 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค.	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย.	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
3,289,000	19 ม.ค. 67	15 ก.ย. 67	5	305,030	305,030	2,983,970	9.27	45

- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด เหลือ 4 งวด

- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2

หมายเหตุ - ได้มีการบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาใหม่

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามเร่งรัดงานโดยการเพิ่มจำนวนคนงานมากขึ้นและผู้รับจ้างยืนยันว่า
สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2567



สรุปผลการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11. สจ. อุทัยธานี
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ภายนอกอาคาร 2,651,700 บาท

วงเงินตาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	ผลเบิกจ่าย สะสม – พ.ค. 67	ผลการเบิกจ่าย สะสม – มิ.ย. 67	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลงาน
1,690,000	12 มิ.ย. 67	20 ก.ย. 67	3			1,690,000		

หมายเหตุ ได้มีการบอกเลิกสัญญา และทำสัญญาใหม่

- สัญญาเดิม วงเงินตามสัญญา 2,198,000 บาท จำนวน 5 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 505,540 บาท
- ลงนามในสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างรายใหม่ วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,690,000 บาท

